



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

**Informe de Gestión
2020 – 2023
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**



**OPORTUNIDAD
Y PROGRESO
PARA TODOS**



**Víctor Manuel Echavarría Vargas
Municipio de San José del Guaviare
Departamento del Guaviare
2020- 2023**



Contenido

TITULO I – INFORME DETALLADO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -2023....	3
CAPITULO 1. LOGROS DE GOBIERNO “OPORTUNIDAD Y PROGRESO PARA TODOS”	3
CAPITULO 2. INFORME DETALLADO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -2023	6
1. Dimensión Social	6
1.1. Programa: Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico, con Oportunidad y Progreso para todos	6
2.1. Programa: Vías e Infraestructura con Oportunidad y Progreso para Todos	46
TULO II – ANALISIS DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA	110
CAPITULO 3. ANALISIS DE INDICADORES BIENESTAR.....	110
1. Programa: Vivienda, agua potable y saneamiento básico con oportunidad y progreso para todos.	110
2. Programa: Vías e infraestructura con oportunidad y progreso para todos.	114
CAPITULO 4. INFORME DETALLADO DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES	116
CAPITULO 5. ACCIONES ADICIONALES RELIZADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.	116
TITULO III. INFORMACIÓN ESTRATEGICA	122
CAPITULO 6. RELACIÓN DE BIENES E INMUEBLES	122
CAPITULO 7. INSTANCIAS DE GOBERNANZA Y DIRECCIÓN	127
CAPITULO 8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN	127
CAPITULO 9. TEMAS A PRIORIZAR AL INICIAR GOBIERNO.....	129
CAPITULO 10. TEMAS ESTRATEGICOS EN TRÁMITE, EN GESTIÓN Y EJECUCIÓN	129
CAPITULO 11. RECOMENDACIONESY SUGERENCIAS PARA EL SIGUIENTE GOBIERNO .	132



TITULO I – INFORME DETALLADO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 - 2023

CAPITULO 1. LOGROS DE GOBIERNO “OPORTUNIDAD Y PROGRESO PARA TODOS”

1. Nombre del Logro: Modernización del sistema de alumbrado publico zona urbana

Descripción: Con el fin de garantizar las condiciones de movilidad y seguridad en la zona urbana del municipio de San José del Guaviare, la administración destino recursos para la modernización del sistema de alumbrado público. De tal manera que se logra la aprobación de 4 proyectos, mediante los cuales se lograra la intervención de más de 50 kilómetros de vías, la reducción de accidentalidad e inseguridad, mayor disponibilidad de control por la fuerza pública, eliminación de tecnologías obsoleta, reducción costos AOM, entre otros beneficios.

Alcance: intervención en 50 kilómetros, desmonte de luminarias obsoletas, construcción de nuevas redes independientes, instalación de equipos de medida, instalación de luminarias tecnología led.

Beneficiarios: Población zona urbana San José del Guaviare.

Registro Fotográfico y/o descripción del detalle documental

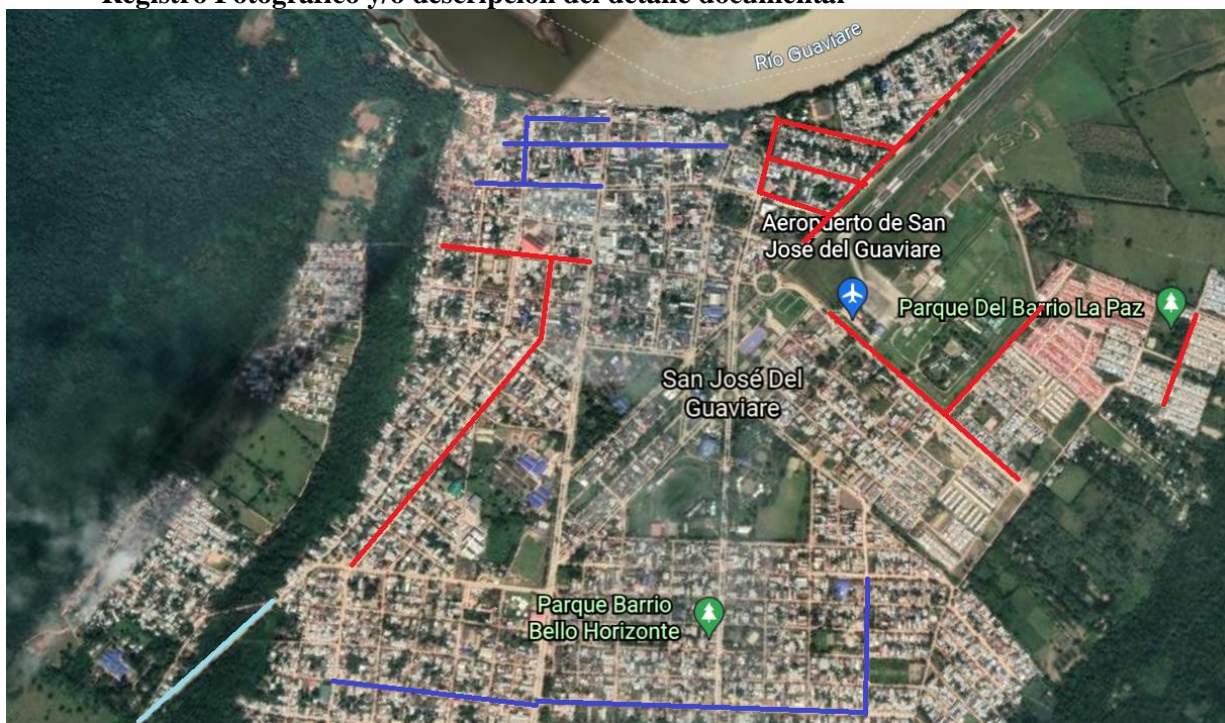


Imagen: Localización general, Proyecto Modernización Alumbrado Público Segunda Etapa, diciembre 2021. Fuente Energuguaviare.

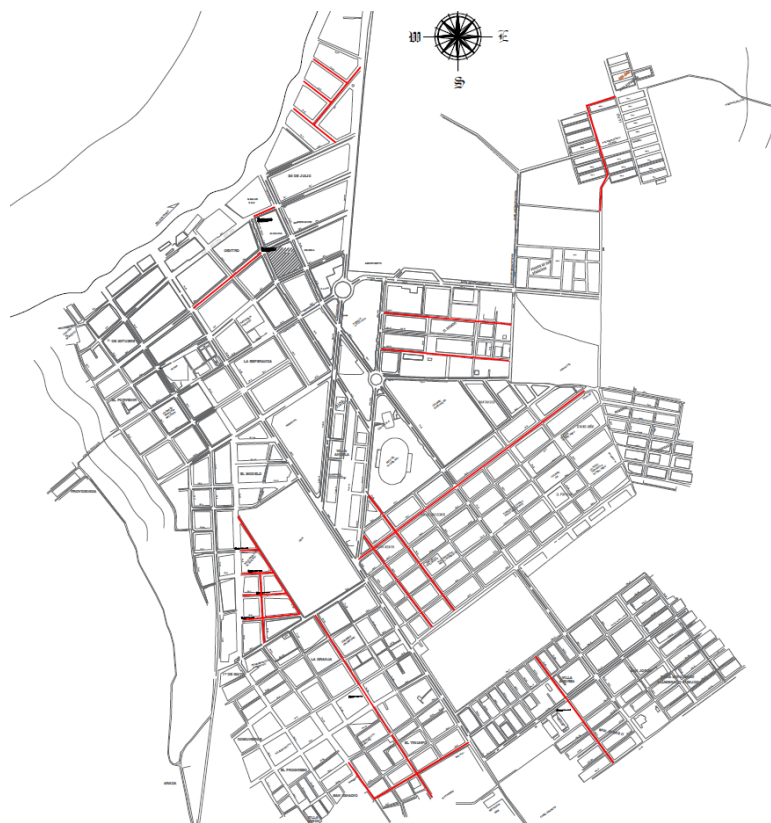


Imagen: Localización general, Proyecto Modernización Alumbrado Público Cuarta Etapa, diciembre 2021. Fuente Energuaviare.

2. Nombre del Logro: Continuidad y Calidad del servicio de Agua Potable zona Urbana

Descripción: En conjunto con la empresa prestadora del Servicio de Acueducto se logró garantizar la prestación del servicio de acueducto de manera continua durante las 24 horas del día (especialmente en época de verano) y en términos de calidad de acuerdo como lo establece el IRCA, por tanto, se contribuyó de esta manera a la garantía al acceso al agua potable que va de la mano con la mejora en la calidad de vida y la práctica de hábitos saludables.

Alcance: Continuidad en la prestación del servicio de acueducto (24 horas del día), con altos niveles de calidad.

Beneficiarios: Población zona urbana de San José del Guaviare.

Registro Fotográfico y/o descripción del detalle documental: Registros de calidad del IRCA y reportes de la empresa Empoaguas.

3. Nombre del Logro: Vivienda de interés social urbana y rural.

Descripción: El municipio a través de las convocatorias del ministerio de vivienda se postuló y pudo acceder a importantes subsidios tanto para el sector urbano como rural, de esta manera se logró disminuir el déficit Habitacional en el territorio. Actualmente se ejecutan proyectos como urbanización Bosques de San Ignacio y en zona rural Vivienda social para el campo, Así mismo se notificó al municipio la asignación de 100 subsidios del programa Cambia mi Casa.

Alcance: Construcción y mejoramiento de vivienda tanto en la zona urbana como rural, 323 hogares. (223 vivienda nueva y 100 mejoramientos)

Beneficiarios: 323 hogares. (223 vivienda nueva y 100 mejoramientos)



Registro Fotográfico y/o descripción del detalle documental: Convenio 076 de 2021, Resoluciones Fonvivienda y Minvivienda de asignación de subsidios.

4. Nombre del Logro: Mejoramiento vial urbano.

Descripción: Construcción de vías en pavimento articulado en sectores de bajo tráfico, logrando mejorar las condiciones de movilidad y convivencia en la zona urbana. Proyecto cuya ejecución se realizó directamente por la administración, su parque automotor y operarios lo cual permitió disminución de costos y mayor alcance.


Alcance: Con el desarrollo del proyecto se logró la ejecución de 2.5 kilómetros de pavimento articulado, cuyas actividades comprendiendo la excavación, aplicación de recebo, base granular, cama de arena, instalación de adoquín, construcción de elementos de confinamiento y drenaje.

Beneficiarios: Población en general, y específica en los barrios Bicentenario 1, Prados de San Sebastián, Bicentenario 2, Belén de la Paz, La Paz, Comcaja, Modelo.

Registro Fotográfico y/o descripción del detalle documental



Registro fotográfico pavimento articulado, Nivel terminado sector Prados y Belén de la Paz, octubre 2022.

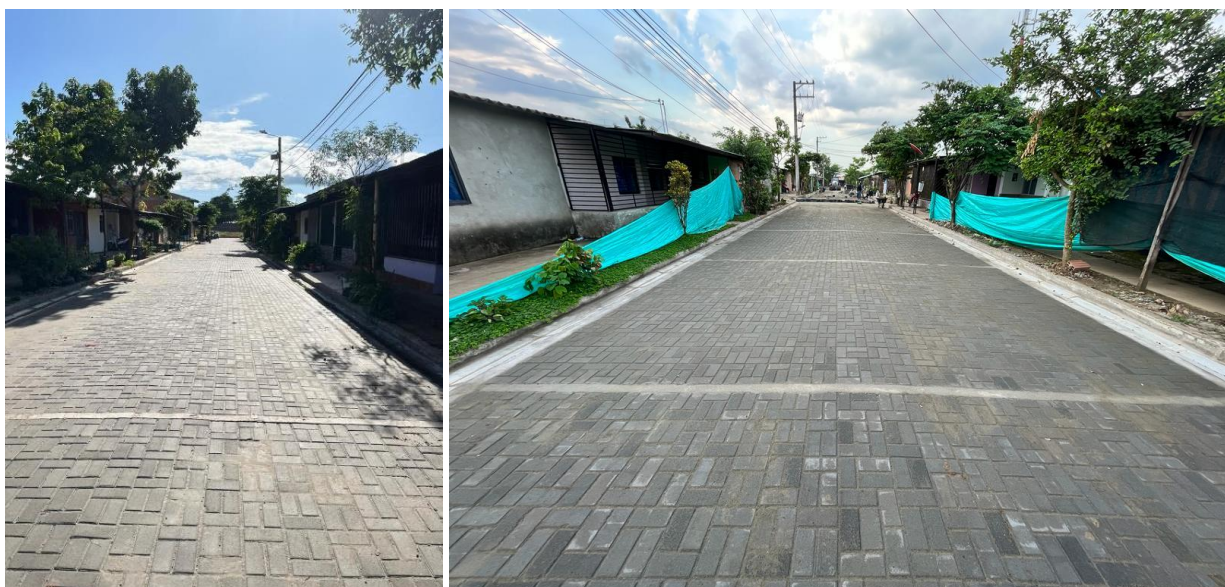

Registro fotográfico pavimento articulado, Nivel terminado sector Prados y Belén de la Paz, octubre 2022.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

5. Nombre del Logro: Mejoramiento vial rural.

Descripción: En cuanto al avance relacionado con la infraestructura para la movilidad en el sector rural, el logro comprende la construcción y aprobación del plan vial municipal, y su adopción de tal manera que se enmarca como instrumento o herramienta de planificación para la definición de la Infraestructura de Transporte a intervenir a cargo de la entidad territorial. Mediante este documento se establece una herramienta orientadora que permite conectar los territorios, permitiendo mejorar las condiciones de la agricultura, el trabajo de las familias y comunidades campesinas.

Alcance: Legalización y formalización de 520 kilómetros de vías terciarias en el municipio.

Beneficiarios: Población zona rural del municipio.

Registro Fotográfico y/o descripción del detalle documental: Acuerdo 005 de 2022 adopción plan vial municipio de San José del Guaviare aprobado por Mintransporte 2020-2029

CAPITULO 2. INFORME DETALLADO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 - 2023

1. Dimensión Social

Línea Estratégica:

1.1. Programa: Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico, con Oportunidad y Progreso para todos

Recursos Financieros: Detalle financiero de los recursos utilizados para cumplimiento de las metas de este programa por vigencia. (Recursos Ejecutados y en ejecución)

Tabla 1. Recursos Ejecutados Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico, con Oportunidad y Progreso para todos

Fuente /Año	2020	2021	2022	2023	Total
Cof. Departamento		\$467.000.000,00			\$467.000.000,00
Cof.Nación					\$0,00
Crédito		\$115.000.000,00	\$115.000.000,00		\$230.000.000,00
Otros					\$0,00
R.P. Con Destinación Específica	\$90.595.820,88				\$90.595.820,88
Recursos Propios Art 7°		\$29.900.000,00	\$24.993.570,00	\$164.140.404,85	\$219.033.974,85
SGP Alim. Escolar					\$0,00
SGP APSB	\$6.660.099.765,50	\$4.358.709.881,16	\$4.952.491.821,79	\$4.735.627.671,17	\$20.706.929.139,62
SGP Cultura					\$0,00
SGP Deportes					\$0,00
SGP Educación					\$0,00
SGP Libre Destinación		\$44.350.241,08	\$34.100.000,00		\$78.450.241,08
SGP Libre Inversión		\$15.900.000,00	\$111.126.000,00	\$55.800.000,00	\$182.826.000,00

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE****INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023**

SGP Salud					\$0,00
Regalías					\$0,00
SGP Libre Destinación 4,5,Y 6 Categoría				\$57.424.600,00	\$57.424.600,00
Total	\$6.750.695.586,38	\$5.030.860.122,24	\$5.237.711.391,79	\$5.012.992.676,02	\$22.032.259.776,43

Tabla 2. Recursos En Ejecución Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico, con Oportunidad y Progreso para todos

Fuente /Año	2020	2021	2022	2023	Total
Cof. Departamento		\$110.220.605,00			\$110.220.605,00
Cof.Nación					\$0,00
Crédito		\$40.241.055,00	\$624.998.267,63		\$665.239.322,63
Otros					\$0,00
R.P. Con Destinación Específica					\$0,00
Recursos Propios Art 7°				\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
SGP Alim. Escolar					\$0,00
SGP APSB			\$59.999.754,45	\$1.994.132.720,51	\$2.054.132.474,96
SGP Cultura					\$0,00
SGP Deportes					\$0,00
SGP Educación					\$0,00
SGP Libre Destinación					\$0,00
SGP Libre Inversión					\$0,00
SGP Salud					\$0,00
Regalías					\$0,00
SGP Libre Destinación 4,5,Y 6 Categoría					\$0,00
Total	\$0,00	\$150.461.660,00	\$684.998.022,08	\$2.094.132.720,51	\$2.929.592.402,59

Metas del Programa

Nota: Cree una sección por cada meta del programa.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
1	Viviendas de Interés Social urbanas Construidas	Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas	Secretaría de Obras Públicas Municipal	59	150	100%

Actividades realizadas

Teniendo en cuenta los recursos dispuestos para los programas de vivienda de interés social en el sector urbano, para el cumplimiento de las metas de este sector, fue necesario acudir a la gestión ante el gobierno nacional, así como a las actuaciones administrativas necesarias para lograr entregar o materializar la totalidad de la meta propuesta. De lo anterior se tiene lo siguiente:

Vigencia 2020



Proyecto: URBANIZACIÓN BOSQUES DE SAN IGNACIO.

Teniendo en cuenta las gestiones realizadas por la Administración Municipal ante el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, se logra la aprobación y asignación en nuestro Municipio del Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario denominado Urbanización Bosques de San Ignacio, el cual consta de 123 subsidios. Para el desarrollo de dicho Proyecto, FONVIVIENDA constituyó el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita, cuyo vocero es el CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA. Una vez el Comité Técnico seleccionó el proyecto a adquirir, se instruyó al Consorcio Alianza Colpatria para la firma del Contrato Promesa de Compraventa, que, para el caso particular, se firmó el Contrato de Promesa de Compraventa No. 1-035 de fecha 28 de febrero de 2020 con la sociedad INVERSIONES PORVENIR S.A.S.

Proyecto URBANIZACIÓN VILLA ANDREA

La Administración Municipal realizó la asignación de 2 apartamentos a beneficiarios del Proyecto.

Adicionalmente durante la vigencia para el apoyo y cumplimiento de las metas de este sector se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios, como fortalecimiento a los procesos administrativos de la Oficina de Vivienda Municipal: CONTRATO DE P.S N°173 DE 2020 y CONTRATO DE P.S N°262 DE 2020.

VIGENCIA 2021

Proyecto URBANIZACIÓN BOSQUES DE SAN IGNACIO.

Se brindó apoyo en el proceso de convocatoria para el Proyecto Urbanización Bosques de San Ignacio en articulación con la Caja de Compensación Familiar - COMCAJA. Como resultado de este ejercicio se logra la asignación de hogares beneficiarios, los cuales fueron seleccionados y habilitados directamente por el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

Proyecto URBANIZACIÓN VILLA ANDREA

La Administración Municipal realizó la asignación de 11 apartamentos a beneficiarios del Proyecto.

Durante la vigencia se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios, como fortalecimiento a los procesos administrativos de la Oficina de Vivienda Municipal: CONTRATO DE P.S N°020 DE 2021, CONTRATO DE P.S N°267 DE 2021.

VIGENCIA 2022

Proyecto URBANIZACIÓN BOSQUES DE SAN IGNACIO.

La Administración Municipal en articulación con el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y FINDETER (Supervisor) realizó el seguimiento al avance de las obras del Proyecto.

Proyecto URBANIZACIÓN VILLA ANDREA



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

La Administración Municipal realizó la asignación de 5 apartamentos a beneficiarios del Proyecto. Por otra parte, y con el ánimo de determinar el estado de vulnerabilidad de la infraestructura siniestrada del proyecto de villa Andrea se suscribió el CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 239 DE 2022 cuyo objeto comprendió: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORÍA PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE LAS TORRES A, B Y D DE LA MANZANA V1 DE LA URBANIZACIÓN VILLA ANDREA.

Durante la vigencia se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios, como fortalecimiento a los procesos administrativos de la Oficina de Vivienda Municipal: CONTRATO DE P.S N°054 DE 2022, CONTRATO DE P.S N°059 DE 2022, CONTRATO DE P.S N°312 DE 2022.

VIGENCIA 2023

Proyecto URBANIZACIÓN BOSQUES DE SAN IGNACIO.

El proyecto cuenta con el total de hogares beneficiarios, los cuales fueron asignados mediante las siguientes Resoluciones expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - FONVIVIENDA:

URB. BOSQUES DE SAN IGNACIO (123)		
N° DE RESOLUCIÓN	FECHA	ASIGNACIONES
2264	24/08/2021	37
2430	27/12/2022	4
2433	27/12/2022	45
2435	27/12/2022	31
690	10/07/2023	6

Tabla Resoluciones expedidas por Fonvivienda – Asignación subsidios.

Proyecto Urb. URBANIZACIÓN VILLA ANDREA

La Administración Municipal realizó la asignación de 1 apartamento a beneficiario del Proyecto. Así mismo, como resultado del proceso de restitución de predios adelantado por la Inspección de Policía Municipal, se logra la recuperación de 17 apartamentos, de los cuales 10 ya fueron entregados a los propietarios.

Durante la vigencia se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios, como fortalecimiento a los procesos administrativos de la Oficina de Vivienda Municipal: CONTRATO DE P.S N°051 DE 2023, CONTRATO DE P.S N°055 DE 2023, CONTRATO DE P.S N°080 DE 2023, CONTRATO DE P.S N°251 DE 2023.

A octubre de 2023 se tiene el siguiente proceso para construcción de VIS: SELECCIONAR UN SOCIO INVERSIONISTA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA UNIÓN TEMPORAL PARA LA FORMULACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CON EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Población beneficiada: con el Proyecto de vivienda de interés social prioritario urbano denominado Urbanización Bosques de San Ignacio se benefician 123 hogares, y del proyecto Villa Andrea 18 hogares.

Retos

- Garantizar seguimiento y gestión ante los ejecutores de los proyectos a fin de lograr la entrega de los Proyectos de Vivienda en los plazos establecidos.
- Disponer de mayores recursos destinados a Programas de Vivienda de interés social.

Recomendaciones

- En proyectos de gestión, solicitar que sea la entidad territorial la ejecutora de las obras o en su efecto que sea supervisora a fin de tomar partida y/o acciones sobre todo en los plazos de ejecución de los proyectos.

Evidencias:

- **Registro Fotográfico**



Imagen. Proy. Urb. Bosques de San Ignacio en construcción Torres de apartamentos (Fuente propia), tomada en diciembre de 2022



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Imagen. Proy. Urb. Bosques de San Ignacio Torres de apartamentos terminadas, febrero 2023.

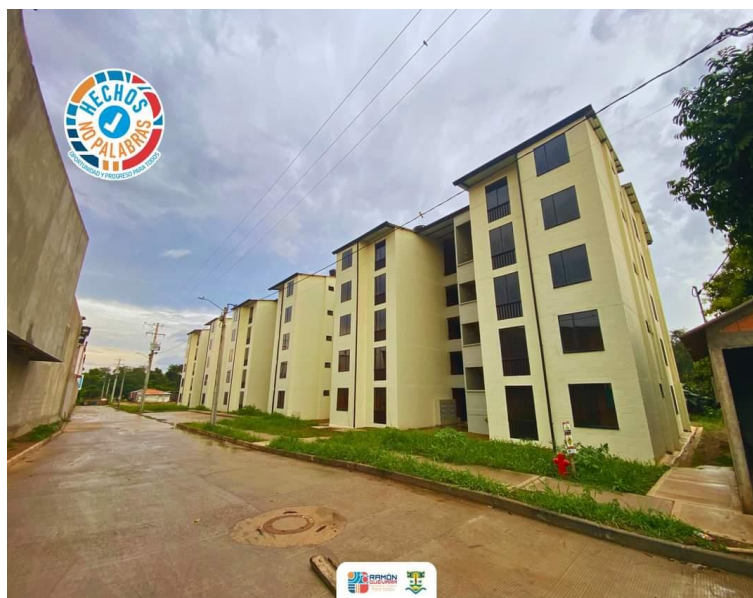


Imagen. Proy. Urb. Bosques de San Ignacio Torres de apartamentos terminadas, junio 2023.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Imagen. Proyecto Villa Andrea, Entrega de apartamentos, febrero 2021.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
2	Gestión y construcción de vivienda de interés social en zona rural	Número de viviendas rurales gestionadas y construidas	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	70	100%

Actividades realizadas

VIGENCIA 2020

Gestiones Administrativas:

Se realiza la gestión ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las entidades operadoras (COMFENALCO SANTANDER y FIDUAGRARIA), para lograr el avance en la ejecución de los proyectos de vivienda rural de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, en las Modalidades: Mejoramientos de vivienda y Vivienda Nueva.

VIGENCIA 2021

Se suscribió el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. DE 2021, entre el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE y el DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, cuyo objeto se refiere a “Aunar esfuerzos para la cofinanciación de cien (100) viviendas construidas con Subsidios Familiares de Vivienda Rurales bajo la modalidad de vivienda nueva en especie a los hogares que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el Decreto 1077 de 2015 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicione.

VIGENCIA 2022



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

La Secretaria de Obras Públicas en trabajo articulado con el MINISTERIO DE VIVIENDA. CIUDAD Y TERRITORIO, apoyó el proceso de convocatoria, postulación, validación de información y recolección de documentación para las subsanaciones, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación N°076 de 2021 suscrito entre el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

Minvivienda suscribió el Contrato de Obra N°028 F-2022, para la ejecución de 100 subsidios familiares de vivienda rural bajo la modalidad de vivienda nueva en especie en el Municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación N°076 de 2021 suscrito entre el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

VIGENCIA 2023

En esta vigencia y a octubre de 2023 se han materializado 78 subsidios de vivienda (en las veredas: San Francisco, Boquerón, Capricho, Caracol, Triunfo II), en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación N°076 de 2021 suscrito entre el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

A continuación, se presenta el estado de los proyectos de vivienda rural:

ESTADO PROYECTOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL 2016, 2017, 2018 Y 2019						
Vig.	VISR 2016	VISR 2017		VISR 2018	VISR 2019	
Modalidad	VIVIENDA NUEVA	VIVIENDA NUEVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VIVIENDA NUEVA	VIVIENDA NUEVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
# Beneficiarios	33	9	45	48	18	21
Avance proceso.	Viabilizados 27	Viabilizados 3	Viabilizados 9	Total Habilitados	16 Habilitados	19 Habilitados
Novedades					2 Renuncias voluntarias	2 Renuncias voluntarias
Estado del P.	Suspendido	Suspendido		Suspendido	Suspendido	

Población beneficiada: Los programas de vivienda rural correspondientes a las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, registran un total de 174 hogares beneficiarios y con el Proyecto de VISR rural 2021 se benefician 100 hogares.

Retos

- Realizar gestiones y/o acciones necesarias ante Ministerio de Agricultura y Banco Agrario para que le logre la culminación de los proyectos de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.
- Gestión en la agilidad en los tiempos para la entrega de los Proyectos de Vivienda.
- Que el Municipio disponga de mayores recursos que puedan ser destinados a Programas de Vivienda Rural.

Recomendaciones

1. Requerir acompañamiento de los entes de control para buscar la culminación de los proyectos de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

2. Que, en los proyectos gestionados, el Municipio pueda ser el ejecutor.
3. Se recomienda que los próximos proyectos de vivienda asignados al Municipio de San José del Guaviare, sea extensiva para otros sectores o grupos poblacionales, de los grupos A y B del SISBEN, sin condición específica del Registro Único de Víctimas (RUV) o de pertenecer a la RED UNIDOS, ya que existen otros hogares que están en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad que requieren una vivienda digna.
4. Requerir a FONVIVIENDA – MINVIVIENDA, que los próximos Proyectos de Subsidios Familiares de Vivienda, no se realicen anticipos. Esto con el fin de garantizar la oportuna materialización y entrega de los subsidios.

Evidencias:

- **Registro Fotográfico**



Imagen acompañamiento a la entrega de viviendas en el sector rural vigencia 2021, Vereda Los Alpes, mayo de 2023.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

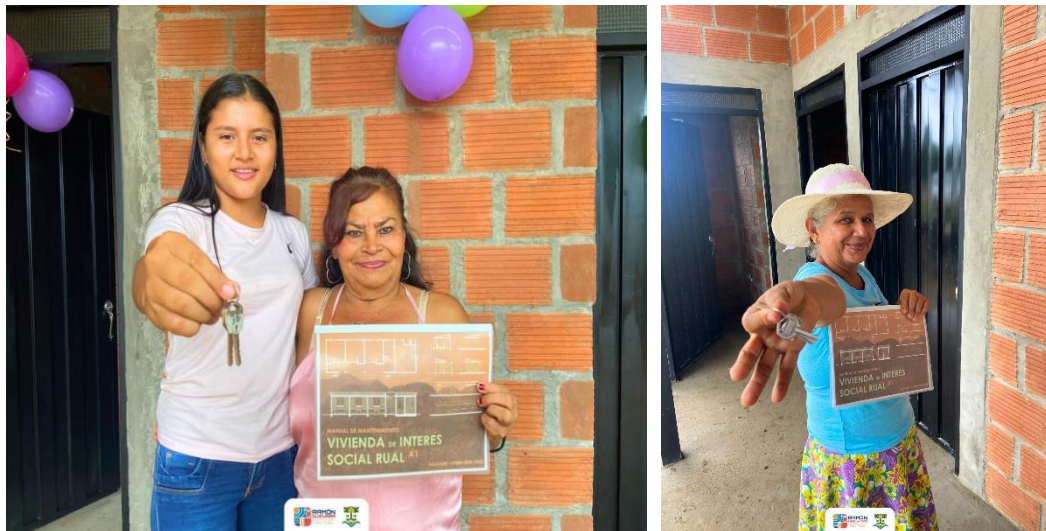


Imagen de beneficiarias participando de la entrega de viviendas en el sector rural vigencia 2021, Vereda Los Alpes, mayo de 2023.

No.	Producto	Meta Producto	Fuente Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
3	Gestionar el Mantenimiento de vivienda	Gestión en el número de viviendas con mantenimiento	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	200	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio realizó el suministro de materiales que fueron entregados a los beneficiarios a fin de que se mejoraran las cubiertas de sus viviendas. De otro lado presentó y aprobó un proyecto ante OCAD PAZ para la construcción de unidades sanitarias, cuyo ejecutor es el municipio del Retorno.

A continuación, se relaciona la información:

- CONTRATO DE SUMINISTRO N°337 DE 2022, cuyo objeto se refiere a CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS COMO APOYO A LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. Se benefició a 73 hogares.
- CONTRATO DE SUMINISTRO N°190 DE 2023, cuyo objeto se refiere a CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. Benefició 28 hogares.
- Proyecto 2021005950135 Cuyo objeto comprende, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CALAMAR, EL RETORNO Y SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. Actualmente se encuentra en ejecución y



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

los beneficiarios en el municipio son 46 viviendas ubicadas en Agua Bonita, Agua Bonita Sector Norte, Retiro y Santo Domingo.

- En el marco del programa Cambia mi casa el municipio se postuló, y mediante RESOLUCIÓN NÚMERO (0938) DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 del ministerio de vivienda, “Por la cual se establecen los recursos disponibles, se conforman las bolsas de mejoramiento urbano y rural y se distribuyen cupos, de acuerdo con los criterios fijados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”, se asignaron 100 mejoramientos de vivienda al municipio.

Retos

- Ampliar la meta de mejoramiento de vivienda tanto en zona urbana como rural, ya que el déficit de vivienda sigue siendo alto, además existen necesidades en cuanto a acabados de muros, unidades sanitarias, acabado de pisos, cubiertas, entre otros.
- Garantizar la ejecución del programa Cambia mi casa.

Recomendaciones

- Focalizar la población objeto del proyecto o de la necesidad previamente a la formalización de los proyectos para garantizar el acceso al subsidio a las personas más necesitadas.
- Realizar seguimiento y acompañamiento al programa de Minvivienda Cambia mi casa.

Evidencias:

- Listado de beneficiarios a los que se realizó la entrega del material para el mejoramiento de cubiertas

ENTREGA LAMINAS DE ZINC 2023			
ITEM	NOMBRES	CEDULA	VEREDA /BARRIO
1	DORIS OMAIRA DIAZ ALFONSO	41241176	MODELO
2	SIXTO ROJAS VALENCILLA	3021971	LA CARPA
3	LUIS ALONSO GOMEZ PAJOY	4925891	ARAZA
4	ALIRIO CESPEDAS ACOSTA	3274699	MANGLARES
5	EUSEBIA MONTAÑO	66760784	BICENTENARIO
6	JOSELIN POVEDA	1176154	BUENOS AIRES
7	EDWIN ANTONIO VELOZA GARAVITO	1120570396	LIMON
8	NUBIA PEREZ	40374463	SANTA LUCIA
9	LUIS EDUARDO PIÑEROS GUZMAN	3273337	CAPRICHIO
10	TERESITA DEL SOCORRO PEREZ	29236286	MODELO
11	ARMANDO TELLEZ TUJUCA	3299998	RESGUARDO PANORE
12	HECTOR MESIAS	97600417	BOCAS DEL RAUDAL
13	NANCY CARDONA RIOS	40360203	BOCAS DEL RAUDAL
14	MAYIBE QUIROGA	51694780	
15	LUIS ALFONSO RODRIGUEZ SILVA	17265386	LA DOS MIL
16	FREDY NORBEIRO ASTROZ	97613775	TRES TEJAS
17	ANA JUDITH TOLOZA	41210565	SABANAS DE LA FUGA
18	YERALDINE GOMEZ RENGIFO	1110532150	
19	MARIA TULIA ARIAS	23604026	BARRIO TRIUNFO
20	CARLOS JULIO MANCERA GALINDO	14209483	BOCAS DEL RAUDAL
ENTREGA LAMINAS DE ZINC 2022			
ITEM	NOMBRES	CEDULA	VEREDA /BARRIO
1	LUZ ELVIRA VARGAS CUBIDES	41214361	FLORIDA 2
2	SANDRA PATRICIA BARCO BARON	41242441	FLORIDA 2



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

3	ALVARO DE JESUS TABORDA GONZALEZ	15914050	FLORIDA 2
4	JUAN DE DIOS PEREZ	10186173	
5	ROSALBA PRADA MORA	40276482	FLORIDA 2
6	RICARDO VELASQUEZ TOLOZA	1006700583	FLORIDA 2
7	ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ DAZA	1006783840	FLORIDA 2
8	OMAIRA FIDELIGNA GOMEZ ROJAS	1120570115	FLORIDA 2
9	WILMER OVALLE ESCARRAGA	7319356	FLORIDA 2
10	JAIR TAPIERO MARULANDA	5886203	GUACAMAYA
11	PABLO ENRIQUE GARAVITO SANCHEZ	97601005	NUEVA GRANADA
12	GLORIA ISABEL RAMIREZ BAUTISTA	40439299	EL TIGRE
13	KETTY LORENA CORDOBA	35696823	CAÑO MOSKU
14	FLOR ELVA GARCIA DE RAMOS	23805488	GUAYABALES
15	ILDALINA CHAVEZ CUBIDES	41213343	ARAZA
16	TERESITA DEL SOCORRO PEREZ	29236286	
17	EDNA LUCIA GALINDO MANJARRES	1120568959	SANTO DOMINGO
18	LEIDY MAYURI VEGA ALFONSO	1006533358	ARAZA
19	MARIA DEL CARMEN GARCIA CARABALI	67002493	MOSKU
20	GILBERTO GORDILLO CIFUENTES	7332741	TRIUNFO I
21	EPOLIDORO RAMIREZ MELO	3283972	CARACOL
22	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CARDONA	7518649	BELLO HORIZONTE
23	MIRYAN GONZALEZ SALINAS	23398831	TRES TEJAS
24	BERTA DUFAY GIRALDO HERRERA	31434032	ARAZA
25	GONZALO ENRIQUE MELCHOR RUIZ	97601762	PORVENIR
26	ANGELA GREGORIA MONTAÑEZ GUZMAN	41213478	PORVENIR
27	RICARDO VELASQUEZ TOLOZA	18221297	PORVENIR
28	PUBLIO ENRIQUE BARRETO ROJAS	4076273	MANANTIALES
29	CARMEN SERRANO RUIZ	55151547	PRADOS SAN SEBASTIAN
30	MARIA NIEVES GARZON URREGO	21183527	TRIUNFO I
31	GLADYS BARRIOS SEPULVEDA	30048570	
32	REINALDO RAMIREZ MONTERO	71183960	
33	JOSE GREGORIO VARGAS CARDENAS	17267303	
34	MARY ROCIO SANCHEZ	1005701203	
35	YEISON BELTRAN TABORDA	1029800024	
36	JOAQUIN QUIROGA	17285276	MANANTIALES
37	JAIME GAMBOA GALEANO	13706275	CAPRICHIO
38	ANTONIO MOLANO MONTERO	18222164	
39	IVAN RAMIREZ ARDILA	18224962	
40	CONSTANZA PATRICIA DIAZ PASCUAS	59676057	
41	NORVEY MENDEZ VILLADA	18435485	
42	WILDER JARAMILLO PEREZ	1120571952	SANTO DOMINGO
43	MANUELA GARZON PATIÑO	1075544990	COMA PERRO
44	JOSE GORGONIO MORALES LOPEZ	82383969	TOMACHIPAN
45	ELEVINIA RENTERIA GARCIA	31987723	
46	BALVINA VARGAS LEON	41211807	
47	BELLANITH BARBOSA PAEZ	1006721673	
48	XIMENA BELTRAN DIAZ	1120563805	
49	JOSE ANGEL CADENA ALVARADO	96601670	
50	FLOR MARIA MENDEZ RIOS	21203496	BELLO HORIZONTE
51	ANA FRANCISCA ECHAVARRIA POSADA	43674678	PRADOS
52	MELIDA GARCIA	41211209	SABANAS BOCAS DE LA FUGA
53	LEONARDO GORDILLO CUESTA	4148088	MESAS LA LINDOSA RIO INIRIDA
54	LEIDY TATIANA URREGO PIÑEROS	1120575437	TRIUNFO II
55	DAHANA VANESSA CARABALI	1006723658	TRIUNFO II
56	EDILBERTO AMADEO MORERA JIMENEZ	97611335	TRIUNFO II
57	ANADIT MAHECHA MORALES	41242546	TRIUNFO II
58	JOSE IGNACIO ANGARITA	6656472	
59	ALICIA MAYORGA CALDERON	21242512	



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

60	ADELAIDA NOVA MARIN	21207924	CAÑO MAKU
61	HELBERT GOMEZ VEGA	3276910	CAÑO MAKU
62	VICTOR EFRAIN GONZALEZ	74325031	CAÑO NILO
63	HECTOR ALFONSO NIÑO TORRES	4071502	CAPRICO
64	LUIS EDUARDO PIÑEROS GUZMAN	3273337	LA ROMPIDA
65	ANA HERMELINA MURILLO DE PERALTA	28900547	PIRAQUIVE
66	JAIME CALDERON	17446379	LOS NARANJOS
67	JONATAN HORTUA MONTES	17265302	RAUDAL
68	SONIA LOPEZ CASTAÑEDA	40342822	COLINAS BAJO
69	JAIR ARIZA	18222252	SANTA LUCIA
70	HORTENCIA CARVAJAL	52442320	MORRO
71	DIOCELINA PEREZ	30048224	PORTAL DE BELEN
72	EDILMA MONTAÑA GUTIERREZ	52546003	LA DOS MIL
73	GLADIS STELLA RODRIGUEZ JIMENEZ	51817963	

No.	Producto	Meta Producto	Fuente Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
4	Acueductos construidos	Plantas de tratamiento de agua potable construidas	Secretaría de Obras Públicas Municipal - Empoaguas	0	3	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio realizó inversiones y gestiones a nivel nacional aprovechando los diferentes mecanismos de financiación de proyectos, de tal manera que se ejecutaron los siguientes proyectos que en sus componentes incluyen la construcción de PTAP en el sector rural:

- Contrato de obra No 273 de 2022 que tiene por objeto “CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CARPA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.”; con este proyecto se benefician 357 personas (Fuente Matriz SIASAR del Plan Departamental de Aguas) zona rural del Municipio de San José del Guaviare.
- Convenio 03 de 2023 “SUSCRIBIR UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA EMPRESA EMPOAGUAS E.S.P PARA LA OPTIMIZACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO RURALES”. En la vereda Guacamayas sector IE y Mirolindo se ejecuta actualmente un sistema de tratamiento. Con la implementación de este proyecto se benefician 1.300 personas (Fuente diagnóstico realizado por parte de la alcaldía municipal para la ejecución de este proyecto).
- Contrato de obra 05 de 2021 (ejecutado por Empoaguas), para la “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA COLINAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE”, para el desarrollo de las actividades diarias presentadas en el

área operativa para el suministro continuo del servicio de acueducto prestado por Empoaguas E.S.P. Proyecto que beneficia más de 500 personas.

- Contrato de obra 02 de 2023 (ejecutado por Empoaguas), para la “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CAÑO BLANCO 2 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE”, Proyecto que beneficia más de 500 personas.

Retos

- Ampliar la cobertura en el suministro de agua potable para el sector rural con la construcción, mejoramiento, optimización y mantenimiento a los sistemas de acueducto toda vez que a la fecha no se supera el 5%.
- Gestionar o asignar recursos para la ejecución de las obras según las consultorías con las que cuenta la entidad.

Recomendaciones

- En los nuevos proyectos incluir el componente empresarial o en su efecto el componente AOM (administración, operación y mantenimiento) a fin de que se capacite a los comités de servicios o juntas de acción comunal, con el fin de que los sistemas sean funcionales en el tiempo.
- Garantizar el suministro de agua de manera constante en los R.I, ya sea mediante mantenimiento a los sistemas o suministro en bloque.

Evidencias:

- **Registro Fotográfico**



Imagen del tanque elevado con la PTAP y la valla informativa del proyecto, Tomada en la vereda Colinas en marzo de 2023, fuente Empoaguas.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Imagen del tanque elevado y la PTAP, Tomada en la vereda La Carpa en octubre de 2023, fuente Propia.

No.	Producto	Meta Producto	Fuente Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
5	Acueductos ampliados	Conexiones domiciliarias instaladas	Secretaría de Obras Públicas Municipal - Empoaguas	540	540	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio realizó inversiones y gestiones a nivel nacional aprovechando los diferentes mecanismos de financiación de proyectos, así como las ejecutadas por parte de la empresa, de tal manera que se ejecutaron los siguientes proyectos que en sus componentes incluyen la construcción de acometidas domiciliarias:

- Contrato de obra No 273 de 2022 que tiene por objeto “CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CARPA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.”; con este proyecto se construyeron 121 acometidas.
- Convenio 03 de 2023 “SUSCRIBIR UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA EMPRESA EMPOAGUAS E.S.P PARA LA OPTIMIZACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO RURALES”. Proyecto que prevé la construcción de 65 acometidas domiciliarias.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

- Contrato de obra 05 de 2021 (ejecutado por Empoaguas), para la “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA COLINAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE”, Se construyeron 22 acometidas domiciliarias.
- Contrato de obra 02 de 2023 (ejecutado por Empoaguas), para la “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CAÑO BLANCO 2 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE”, Se proyecta la construcción de 14 acometidas domiciliarias.
- Las demás acometidas se construyeron en: proyecto de vivienda San Ignacio: 123 acometidas domiciliarias, y las ejecutadas por la empresa Empoaguas en la zona urbana.

Retos

- Solicitar y/o gestionar la conexión del 100% de los usuarios del sector urbano al sistema de acueducto a fin de combatir problemas asociados a la salud.

Recomendaciones

- Se recomienda la realización de ampliación de redes urbanas a fin de lograr una cobertura mayor y poder garantizar disponibilidad para la conexión de nuevos usuarios.

Evidencias: Registro Fotográfico





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Imagen del tanque las acometidas domiciliarias, Tomada en la vereda La Carpa en octubre de 2023, fuente Propia.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
6	Acueductos ampliados	Metros lineales de Red de distribución ampliada	Secretaría de Obras Públicas Municipal - Empoaguas	5.000	5.000	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio realizó inversiones y gestiones a nivel nacional aprovechando los diferentes mecanismos de financiación de proyectos, así como las ejecutadas por parte de la empresa, de tal manera que se ejecutaron los siguientes proyectos que en sus componentes incluyen la construcción o ampliación de redes de acueducto:

- Contrato de obra No 273 de 2022 que tiene por objeto “CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CARPA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.”; con este proyecto se ampliaron 2100 metros lineales de red.
- Convenio 03 de 2023 “SUSCRIBIR UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA EMPRESA EMPOAGUAS E.S.P PARA LA OPTIMIZACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO RURALES”. Proyecto que prevé en Mirolindo 180 metros lineales de red, en Capricho ampliación de 675 metros lineales y en Guacamayas 140 metros lineales de red de acueducto y 190 metros en los resguardos indígenas de Barrancón y la María.
- Contrato de obra 05 de 2021 (ejecutado por Empoaguas), para la “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA COLINAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE”, Se construyeron 980 metros lineales de red de acueducto.
- Contrato de obra 02 de 2023 (ejecutado por Empoaguas), para la “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CAÑO BLANCO 2 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE”, Se proyecta la construcción de 823 metros lineales de red de acueducto.
- La empresa prestadora del servicio de acueducto también realizó ampliación de redes en el sector urbano.

Retos



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

- Ampliación de redes para garantizar disponibilidad de servicio en la zona urbana de acuerdo a la actualización del PBOT.
- Ampliación y/o cambio de redes en centros poblados rurales.

Recomendaciones

- Se recomienda tener en cuenta las consultorías o estudios y diseños existentes en la entidad para la ejecución de proyectos del sector de agua potable.

Evidencias: Registro Fotográfico

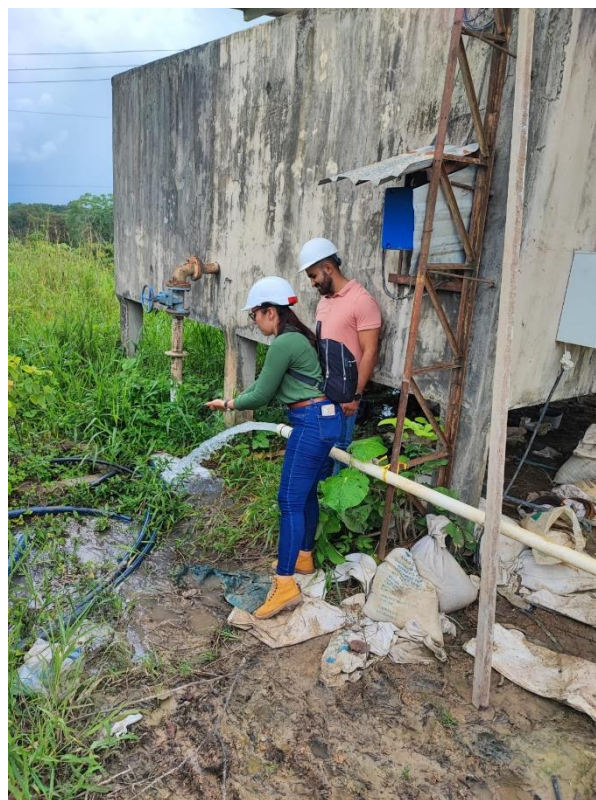


Imagen de la excavación y red de tubería del acueducto de la Carpa, Tomada en la vereda La Carpa en octubre de 2023, fuente Propia.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
7	Mantenimiento de Unidades de tratamiento de agua potable en el área rural	Número de UTAPS con mantenimiento	Secretaría de Obras Públicas Municipal	15	15	100%

Actividades realizadas



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Para el cumplimiento de esta meta el municipio realizó inversiones relacionadas con la intervención en los sistemas de acueducto en algunos resguardos indígenas JIW, a continuación, se relacionan los procesos:

- Convenio 001 -2021. Convenio interadministrativo entre la alcaldía municipal de San José del Guaviare y la empresa Empoaguas e.s.p. para aunar esfuerzos y recursos para el mantenimiento correctivo y rutinario de unidades de tratamiento de agua potable utaps en resguardos indígenas del municipio de San José del Guaviare.

Se realizó el mantenimiento preventivo y rutinario a las unidades de tratamiento de agua potable UTAP, para las comunidades de los resguardos indígenas de BARRANCON (**Mocuare, Libertad, Escuela, Maruya, Palmeras, Palmeras 2, Barranco Colorado, Pipirera, Refugio**) Y LA MARIA (**La María**), consistente en el lavado de tanques, bandejas de aireación, cambio de carbón coque instalación de dosificadores de cloro, descapote, instalación de llaves, mantenimiento eléctrico cambio de contactores, sensores de nivel y adecuación de una UTAP instalación de bomba sumergible entre otros.

- Convenio 03 de 2023 “SUSCRIBIR UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA EMPRESA EMPOAGUAS E.S.P PARA LA OPTIMIZACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO RURALES”.

Mediante este proceso se prevé intervenir los siguientes sectores: RI La María, y en Barrancón los Sectores Maruya 1, Maruya 2, Pipirera.

Retos

- Garantizar la continuidad de la prestación del servicio de agua potable en los resguardos indígenas del área rural.
- Capacitar la población étnica para la operación y manejo de los sistemas de acueducto en cada sector.

Recomendaciones

- Se recomienda realizar mantenimientos rutinarios y preventivos a los sistemas de acueducto de las comunidades indígenas por lo menos una vez al año, y garantizar comunicación asertiva con los líderes para que se esté informando sobre el funcionamiento de los mismos.
- Elaborar manuales de operación y socializarlos con la comunidad de tal manera que se garantice la orientación para el funcionamiento de estos y su durabilidad en el tiempo.

Evidencias: Registro Fotográfico



Imagen del antes y después de una bandeja de aireación de una Utap, limpieza y cambio del carbón coque, Tomada en el RI Barrancón, en diciembre de 2021, fuente Propia.



Imagen de una bomba sumergible de una Utap y proceso de mantenimiento, Tomada en el RI Barrancón, en diciembre de 2021, fuente Propia.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Imagen del mantenimiento y limpieza a las bandejas de aireación de una Utap, Tomada en el RI Barrancón, en diciembre de 2021, fuente Propia

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
8	Construcción de Unidades de tratamiento de agua potable en el área rural	Número de UTAPS construidas	Secretaría de Obras Públicas Municipal	15	1	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio cuenta con el siguiente proyecto en ejecución que prevé la construcción de una UTAP en el resguardo indígena Barrancón sector MARUYA 2.

- Convenio 03 de 2023 “Suscribir un convenio interadministrativo entre la alcaldía del municipio de San José del Guaviare y la empresa Empoaguas e.s.p para la optimización ampliación y mejoramiento de acueductos y sistemas de abastecimiento rurales”.

De otro lado, con cooperación internacional en el año 2022 se construyó una UTAP en el resguardo indígena Barrancón, sector Palmeras, donada por Surgical Volunteers International y la Fundación Prescribing Lite.

Retos

- Garantizar la continuidad de la prestación del servicio de agua potable en los resguardos indígenas del área rural.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

- Capacitar la población étnica para la operación y manejo de los sistemas de acueducto en cada sector.

Recomendaciones

- Se recomienda realizar mantenimientos rutinarios y preventivos a los sistemas de acueducto de las comunidades indígenas por lo menos una vez al año, y garantizar comunicación asertiva con los líderes para que se esté informando sobre el funcionamiento de los mismos.
- Elaborar manuales de operación y socializarlos con la comunidad de tal manera que se garantice la orientación para el funcionamiento de estos y su durabilidad en el tiempo.

Evidencias: Registro Fotográfico



Imágenes del suministro de agua potable y planta de tratamiento, Tomada en el RI Barrancón sector Palmeras, en diciembre de 2022, fuente PDA.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
9	Proyecto de diseño e implementación de sistemas de captación de agua para los centros poblados y establecimientos educativos rurales del municipio	Programas, proyectos e iniciativas formulados, gestionados e implementados	Secretaría de Obras Públicas Municipal – Empoaguas.	0	1	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio formulo y presento ante el OCAD PAZ el proyecto SUMINISTRO DE “DOTACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE AMBIENTE APRENDIZAJE Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE PROYECTO BPIN 20201301010700”. El proyecto fue aprobado y se designó como ejecutor a Empoaguas.

Retos



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

- Garantizar el mantenimiento y sostenimiento de los sistemas de filtración entregados a las instituciones educativas del área rural, en coordinación con la secretaria de educación departamental y municipal.
- Capacitar la población del sector educativo para la operación y manejo de los sistemas de de filtración en cada sector.

Recomendaciones

- Se recomienda realizar mantenimientos rutinarios y preventivos a los sistemas de filtración en cada institución educativo.
- Elaborar manuales de operación y socializarlos con la comunidad de tal manera que se garantice la orientación para el funcionamiento de estos y su durabilidad en el tiempo.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
10	Proyectos de Acueductos	Proyectos gestionados y ejecutados	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	2	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio realizó inversiones y gestiones a nivel nacional aprovechando los diferentes mecanismos de financiación de proyectos, así como los ejecutados por la Empresa Empoaguas, de tal manera que se ejecutaron y ejecutan las siguientes:

- Convenio 03 de 2023 proyecto en ejecución, cuyo objeto comprende “SUSCRIBIR UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA EMPRESA EMPOAGUAS E.S.P PARA LA OPTIMIZACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO RURALES”. En la vereda Guacamayas sector IE se prevé la construcción de un sistema de acueducto para garantizar el derecho al acceso al agua potable a la comunidad educativa.
- Contrato de obra 02 de 2023 (ejecutado por Empoaguas), para la “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CAÑO BLANCO 2 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE”

Adicionalmente a los proyectos en mención, el municipio suscribió el siguiente contrato de consultoría:

- Contrato 365 de 2022: realizar los estudios de optimización y diseño de acueductos rurales de centros nucleados y diseño de sistema de abastecimiento y potabilización para un resguardo indígena del municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
- Contrato 376-2021: Contratar una consultoría para realizar estudios y diseños de soluciones de agua potable y saneamiento básico para las veredas del Edén, Puerto Tolima, El Limón, Y



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Estudios Y Diseños De Soluciones De Agua Potable Para Las Veredas De Santa Lucia, Santa Rosa, Santa Rosa Baja Y Santa Rita Del municipio de san José del Guaviare.

Retos

- Ampliar la cobertura en el suministro de agua potable para el sector rural con la construcción, mejoramiento, optimización y mantenimiento a los sistemas de acueducto toda vez que a la fecha no se supera el 5%.
- Gestionar o asignar recursos para la ejecución de las obras según las consultorías con las que cuenta la entidad.

Recomendaciones

- En los nuevos proyectos incluir el componente empresarial o en su efecto el componente AOM (administración, operación y mantenimiento) a fin de que se capacite a los comités de servicios o juntas de acción comunal, con el fin de que los sistemas sean funcionales en el tiempo.

Evidencias: Registro Fotográfico



Fotografías tomadas durante la ejecución del convenio 003, Levantamiento Topográfico, Vereda Guacamayas sector IE, agosto 2023. (Fuente propia)



Fotografías tomadas durante la ejecución del convenio 003, Estudio geo eléctrico Vereda Guacamayas sector IE, agosto 2023. (Fuente propia)

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE****INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023**

No.	Producto	Meta Producto	Fuente Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
11	Acueductos optimizados	Acueductos optimizados	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	1	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio realizó inversiones y gestiones a nivel nacional aprovechando los diferentes mecanismos de financiación de proyectos, de tal manera que se ejecutaron y se ejecutan los siguientes proyectos que en sus componentes incluyen la optimización de acueductos:

- Contrato de obra No 273 de 2022 que tiene por objeto “CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CARPA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.”; con este proyecto se benefician 357 personas (Fuente Matriz SIASAR del Plan Departamental de Aguas) zona rural del Municipio de San José del Guaviare.
- Convenio 03 de 2023 “SUSCRIBIR UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA EMPRESA EMPOAGUAS E.S.P PARA LA OPTIMIZACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO RURALES”. Con la implementación de este proyecto se benefician 1.300 personas (Fuente diagnóstico realizado por parte de la alcaldía municipal para la ejecución de este proyecto).
- Contrato de obra 05 de 2021 (ejecutado por Empoaguas), para la “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA COLINAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE”, para el desarrollo de las actividades diarias presentadas en el área operativa para el suministro continuo del servicio de acueducto prestado por Empoaguas E.S.P. Proyecto que beneficia más de 500 personas.

Adicionalmente a los proyectos en mención, el municipio suscribió el siguiente contrato de consultoría:

- Contrato 365 de 2022: realizar los estudios de optimización y diseño de acueductos rurales de centros nucleados y diseño de sistema de abastecimiento y potabilización para un resguardo indígena del municipio de San José del Guaviare, Guaviare.

Retos

- Ampliar la cobertura en el suministro de agua potable para el sector rural con la construcción, mejoramiento, optimización y mantenimiento a los sistemas de acueducto toda vez que a la fecha no se supera el 5%.
- Gestionar o asignar recursos para la ejecución de las obras según las consultorías con las que cuenta la entidad.

Recomendaciones



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

- En los nuevos proyectos incluir el componente empresarial o en su efecto el componente AOM (administración, operación y mantenimiento) a fin de que se capacite a los comités de servicios o juntas de acción comunal, con el fin de que los sistemas sean funcionales en el tiempo.
- Garantizar el suministro de agua de manera constante en los R.I, ya sea mediante mantenimiento a los sistemas o suministro en bloque.

Evidencias:

- **Registro Fotográfico**



Imagen del tanque elevado con la PTAP y la valla informativa del proyecto, Tomada en la vereda Colinas en marzo de 2023, fuente Empoaguas.



Imagen del tanque elevado y la PTAP, Tomada en la vereda La Carpa en octubre de 2023, fuente Propia.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE****INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023**

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
12	Acueductos optimizados	Bocatoma Optimizadas	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	1	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio realizó inversiones en la presente vigencia de tal manera que se ejecuta en la actualidad el siguiente proyecto:

- Convenio 03 de 2023 proyecto en ejecución, cuyo objeto comprende “SUSCRIBIR UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA EMPRESA EMPOAGUAS E.S.P PARA LA OPTIMIZACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO RURALES”. En la Mirolindo se prevé la intervención de la bocatoma a fin de ampliar su capacidad, sin embargo, la comunidad propuso un sistema de abastecimiento alterno.

Adicionalmente la empresa Empoaguas realizó intervenciones en el embalse la María a fin de mejorar las condiciones de la Bocatoma.

Retos

- Garantizar las condiciones de estabilidad en la infraestructura de la bocatoma del sistema de acueducto urbano, en el embalse la María. Lo anterior teniendo en cuenta los informes remitidos por parte de la empresa prestadora del servicio de acueducto.

Recomendaciones

- Destinar recursos para realizar estudios de vulnerabilidad a la bocatoma del embalse La María, así como para las intervenciones necesarias a fin de garantizar las obras necesarias para reforzar estructuralmente la infraestructura o en su efecto se garantice la estabilidad.
- Requerir al Departamento los productos de la consultoría liderada por el PDA con cuyo objeto comprende la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO PRIMARIO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (CAPTACIÓN, BOCATOMA – DESARENADOR), DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, y realizar las gestiones pertinentes ante los mecanismos financiadores de proyectos.

Evidencias: Registro Fotográfico



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Fotografías tomadas durante la presentación del proyecto a la comunidad, Corregimiento el Capricho, Julio 2023. (Fuente propia)

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
13	Alcantarillados construidos	Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	2	0%

Actividades realizadas

No se obtuvo avance físico en la meta, sin embargo, el municipio realizó la siguiente consultoría la cual fue presentada a la ventanilla única Departamental obteniendo aval técnico, pero no se cuenta con los recursos para financiar la iniciativa:

- Contrato 376-2021: Contratar una consultoría para realizar estudios y diseños de soluciones de agua potable y **saneamiento básico** para las veredas del Edén, Puerto Tolima, El Limón, Y Estudios Y Diseños De Soluciones De Agua Potable Para Las Veredas De Santa Lucia, Santa Rosa, Santa Rosa Baja Y Santa Rita Del municipio de san José del Guaviare.

Adicionalmente la empresa Empoaguas se encuentra ejecutando el proyecto cuyo objeto comprende: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y **ALCANTARILLADO SANITARIO** DE LA VEREDA CAÑO BLANCO 2 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE”, No obstante, revisada la información contractual el componente de alcantarillado sanitario del proyecto obedece a soluciones individuales por usuario (unidades sanitarias).

Retos

- Construcción de la PTAR para el casco urbano del municipio de San José del Guaviare, y de los centros poblados rurales con mayor crecimiento o que se encuentren realizando contaminación de fuentes hídricas.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Recomendaciones

- Requerir al Departamento los productos de la consultoría liderada por el PDA con cuyo objeto comprende la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES - PTAR Y COLECTOR PERIMETRAL SOBRE EL RIO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, y realizar las gestiones pertinentes ante los mecanismos financiadores de proyectos.
- Revisar en conjunto con el PDA los procesos de consultoría de alcantarillados que se tengan finalizados y recibidos, a fin de buscarle fuente de financiación y poder dar cumplimiento a la meta del programa.

Evidencias: No aplica.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
14	Alcantarillados ampliados	Metros lineales Red de alcantarillado ampliada	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	3.000	25%

Actividades realizadas

Para dar alcance a la meta de red de alcantarillado el municipio se encuentra ejecutando el siguiente proyecto:

- Convenio 002-2023 cuyo objeto comprende: Suscribir un convenio interadministrativo entre la alcaldía del municipio de San José del Guaviare y la empresa Empoaguas e.s.p para la optimización del alcantarillado sanitario en algunos tramos del área urbana del municipio de San José del Guaviare. El proyecto contemplo la ampliación de 750 metros lineales de red en los barrios Villa Andrea y 20 de julio.

Retos

- Ampliación de redes de acuerdo a la actualización del PBOT a fin de garantizar disponibilidad del servicio y evitar focos de contaminación ambiental,
- Reposición de redes que se encuentran obsoletas u obstruidas en el alcantarillado del área urbana del municipio de San José del Guaviare.

Recomendaciones

- Se recomienda la intervención en las redes de alcantarillado en los puntos críticos detectados en los Barrios del Suroccidente.
- Se recomienda la conexión de los usuarios que se encuentran realizando vertimientos directos de aguas residuales a los canales de aguas lluvias en la zona urbana.



Evidencias: Registro fotográfico.



Fotografías tomadas durante la instalación de redes de alcantarillado, Barrios 20 de julio y Villa Andrea, septiembre de 2023. (Fuente propia)

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
15	Alcantarillados optimizados	Alcantarillados optimizados	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	1	100%

Actividades realizadas

Para dar alcance a la meta de optimización de alcantarillados, el municipio se encuentra ejecutando el siguiente proyecto:

- Convenio 002-2023 cuyo objeto comprende: Suscribir un convenio interadministrativo entre la alcaldía del municipio de San José del Guaviare y la empresa Empoaguas e.s.p para la optimización del alcantarillado sanitario en algunos tramos del área urbana del municipio de San José del Guaviare. El proyecto contempla la limpieza de redes, conexión de redes a colectores principales, ampliación de redes, conexión de nuevos usuarios y eliminación de vertimientos directos.

Retos



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

- Ampliación y optimización de redes de acuerdo a la actualización del PBOT a fin de garantizar disponibilidad del servicio y evitar focos de contaminación ambiental.
- Reposición de redes que se encuentran obsoletas u obstruidas en el alcantarillado del área urbana del municipio de San José del Guaviare.

Recomendaciones

- Se recomienda la intervención en las redes de alcantarillado en los puntos críticos detectados en los Barrios del Suroccidente.
- Se recomienda la conexión de los usuarios que se encuentran realizando vertimientos directos de aguas residuales a los canales de aguas lluvias en la zona urbana.

Evidencias: Registro fotográfico.



Fotografías tomadas durante la limpieza de redes de alcantarillado, Barrio Porvenir, septiembre de 2023.
(Fuente propia)



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Fotografías tomadas durante la instalación de tubería de alcantarillado, Barrio Villa Andrea, septiembre de 2023. (Fuente propia)

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
16	Gestión y construcción de alcantarillados sanitarios	Alcantarillados sanitarios en el área rural gestionados y construidos	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	1	100%

Actividades realizadas

Actualmente la empresa Empoaguas se encuentra ejecutando el proyecto cuyo objeto comprende: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CAÑO BLANCO 2 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE”.

Retos

- Construcción de alcantarillados para el casco urbano del municipio de San José del Guaviare que no tiene cobertura, y de los centros poblados rurales con mayor crecimiento o que se encuentren realizando contaminación de fuentes hídricas.

Recomendaciones

- Requerir al Departamento los productos de la consultoría liderada por el PDA con cuyo objeto comprende la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES - PTAR Y COLECTOR PERIMETRAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

SOBRE EL RIO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, y realizar las gestiones pertinentes ante los mecanismos financiadores de proyectos.

- Revisar en conjunto con el PDA los procesos de consultoría de alcantarillados que se tengan finalizados y recibidos, a fin de buscarle fuente de financiación y poder dar cumplimiento a la meta del programa.

Evidencias: No aplica.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
17	Sistemas de acueducto unifamiliar	Número de acueductos unifamiliares gestionados y/o construidos	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	50	0%

Actividades realizadas

No se obtuvo avance físico en la meta, sin embargo, el municipio realizó la siguiente consultoría la cual fue presentada a la ventanilla única Departamental obteniendo aval técnico, pero no se contó con los recursos para financiar la iniciativa:

- Contrato 376-2021: Contratar una consultoría para realizar estudios y diseños de soluciones de agua potable y saneamiento básico para las veredas del Edén, Puerto Tolima, El Limón, Y Estudios Y Diseños De Soluciones De Agua Potable Para Las Veredas De Santa Lucia, Santa Rosa, Santa Rosa Baja Y Santa Rita Del municipio de san José del Guaviare.

Retos

- Garantizar acceso al agua potable a la comunidad del sector rural disperso, mediante la construcción de soluciones individuales y/o micro acueductos, e implementación de alternativas para mejorar las características del agua para el consumo humano.

Recomendaciones

- Realizar seguimiento a los proyectos presentados al Ministerio de Vivienda para Viabilización, entre los cuales se encuentra la consultoría del proceso 376-2021. O en su efecto gestionar los recursos para lograr el cumplimiento de la meta.
- Revisar en conjunto con el PDA los procesos de consultoría de soluciones individuales que se tengan finalizados y recibidos, a fin de buscarle fuente de financiación y poder dar cumplimiento a la meta del programa.

Evidencias: No aplica.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE****INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023**

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
18	Gestión del mantenimiento de canales de aguas lluvias en el área urbana y rural	Metros lineales de mantenimiento de canales de aguas lluvias	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	3.500	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio celebro los siguientes contratos:

- Contrato VI-002-2022, objeto: Suscribir un convenio interadministrativo entre el municipio de San José del Guaviare y la empresa Empoaguas e.s.p para el mantenimiento y construcción de canales de aguas lluvia en el área urbana de San José del Guaviare.
- CONVENIO No 001 de 2020 Objeto: suscribir un convenio Interadministrativo entre el municipio de San José del Guaviare y la empresa EMPOAGUAS E.S.P para el mantenimiento y limpieza de canales de aguas lluvias en el área urbana del municipio de San José del Guaviare.

Mediante la ejecución de estos convenios se realizó el mantenimiento de 14112,03 metros lineales de limpieza manual de canal en concreto cerrado, mantenimiento de 4432,55 metros lineales limpieza manual de canal en concreto abierto y mantenimiento de 3460,84 metros lineales de limpieza manual de canal en tierra, dando un consolidado en mantenimiento de canales de 22005,42 metros lineales. Las actividades desarrolladas comprendieron la remoción de material vegetal, remoción de tierra, lodo, basura, el transporte y disposición final de lodos.

Retos

- Garantizar que los canales, drenajes y ductos para el manejo de las aguas lluvias, se mantengan libres de lodo, basura y material vegetal, especialmente en época de invierno para evitar inundación y proliferación de agentes nocivos para la salud.
- Exigir en los procesos de otorgamiento de licencias de construcción la conservación de los canales para el manejo de las aguas lluvias.

Recomendaciones


- Realizar jornadas de limpieza de canales, recolección de inservibles y atención de puntos críticos a fin de disponer de sistemas con capacidad durante la temporada invernal.
- Garantizar que en los nuevos proyectos de pavimentación se cuente con la infraestructura necesaria para el manejo de las aguas lluvias.

Evidencias: registro fotográfico.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

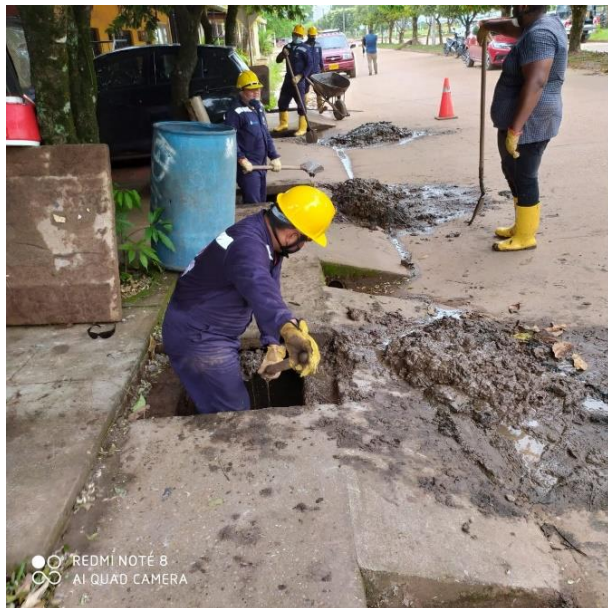

Fotografías tomadas durante la limpieza de canales de aguas lluvias, Zona Urbana Barrio la Paz, noviembre de 2020. (Fuente propia)



Fotografías tomadas durante la limpieza de canales de aguas lluvias, Zona Urbana Barrio Dorado y la Paz, noviembre de 2020. (Fuente propia)



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Fotografías tomadas durante la limpieza de canales de aguas lluvias, Zona Urbana Barrio Villa Andrea, noviembre de 2022. (Fuente propia)

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
19	Gestión de la construcción de canales de aguas lluvias en el área urbana y en los centros poblados de la zona rural	Metros lineales de construcción de canales de aguas lluvias	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	2.500	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio contó con los siguientes procesos:

- Contrato de obra No. 407 de 2020: Contratar la construcción de canales de aguas lluvias en el área urbana del municipio de San José del Guaviare.

Mediante este proceso se llevó a cabo la construcción de un canal de aguas lluvias en la calle 14 entre carreras 28 y 29, de igual manera se llevó a cabo la construcción de canal sobre la carrera 29 hacia Panuré, se construyeron en total 436 metros lineales de canal de aguas lluvias, con sus respectivas rejillas para la recolección de las aguas lluvias, tapas de inspección y descole. Barrios impactados: Dorado, Divino niño. Sueños de Prosperidad, Los Rosales, Nuevo Amanecer y Bicentenario 2.

Ahora bien, con la ejecución de los proyectos de pavimento en la zona urbana del municipio de San José del Guaviare donde la entidad actuó como Interventor de este proyecto cuya fuente de financiación fue Regalías, se construyeron obras para el manejo de las aguas lluvias en una distancia de 2363 metros lineales distribuidos en las vías:

- Calle 18 Entre transversal 20 y la Cra 29.
- Calle 5 Entre cara 28 y puente Panure.
- Calle 17 Entre Cra 24 y Cra 28.



En el proyecto de Pavimentación de la avenida principal del Capricho se ejecutaron 180 metros lineales de canalización de aguas lluvias.

Las canales construidas para el cumplimiento de la meta se realizaron en concreto y otros tramos en tubería Pvc sanitaria de 18 a 24 pulgadas.

Retos

- Garantizar que los canales, drenajes y ductos para el manejo de las aguas lluvias, se mantengan libres de lodo, basura y material vegetal, especialmente en época de invierno para evitar inundación y proliferación de agentes nocivos para la salud.
- Exigir en los procesos de otorgamiento de licencias de construcción la conservación de los canales para el manejo de las aguas lluvias.

Recomendaciones

- Realizar jornadas de limpieza de canales, recolección de inservibles y atención de puntos críticos a fin de disponer de sistemas con capacidad durante la temporada invernal.
- Garantizar que en los nuevos proyectos de pavimentación se cuente con la infraestructura necesaria para el manejo de las aguas lluvias.

Evidencias: registro fotográfico.



Fotografías tomadas durante la excavación para la construcción de canales de aguas lluvias, Zona Urbana Barrio de prosperidad, diciembre de 2020. (Fuente propia)



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Fotografías tomadas durante la construcción y terminación de los canales de aguas lluvias, Zona Urbana Barrio Dorado y la Paz, noviembre de 2020. (Fuente propia)

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente Responsable	-	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
20	Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas	Viviendas rurales beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias	Secretaría de Obras Públicas Municipal		0	250	24%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio en conjunto con Calamar y Retorno presentaron y se aprobó un proyecto ante OCAD PAZ para la construcción de unidades sanitarias, cuyo ejecutor es el municipio del Retorno.

A continuación, se relaciona la información:

- Proyecto 2021005950135 Cuyo objeto comprende, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CALAMAR, EL RETORNO Y SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. Actualmente se encuentra en ejecución y los beneficiarios en el municipio son 46 viviendas ubicadas en Agua Bonita, Agua Bonita Sector Norte, Retiro y Santo Domingo.
- La empresa Emptoaguas se encuentra ejecutando el proyecto cuyo objeto comprende: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CAÑO BLANCO 2 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE”, el componente de alcantarillado sanitario del proyecto obedece a soluciones individuales por usuario (14 unidades sanitarias).
- Contrato 376-2021: Contratar una consultoría para realizar estudios y diseños de soluciones de agua potable y saneamiento básico para las veredas del Edén, Puerto Tolima, El Limón, Y Estudios Y Diseños De Soluciones De Agua Potable Para Las Veredas De Santa Lucia, Santa



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Rosa, Santa Rosa Baja Y Santa Rita Del municipio de San José del Guaviare. el municipio realizó la consultoría la cual fue presentada a la ventanilla única Departamental obteniendo aval técnico, pero no se contó con los recursos para financiar la iniciativa.

Retos

- Retomar los proyectos de mejoramiento de vivienda mediante la construcción de unidades sanitarias, presentados al OCAD PAZ, a fin de obtener la aprobación de los mismos.

Recomendaciones

- Focalizar la población objeto del proyecto o de la necesidad previamente a la formalización de los proyectos para garantizar el acceso al subsidio a las personas más necesitadas.
- Realizar seguimiento y acompañamiento al programa de Minvivienda Cambia mi casa, y solicitar que el mejoramiento abarque la construcción de unidades sanitarias.

Evidencias:

- Registro Fotográfico**

Detalle del Proceso Número: 03-2022

GUAVIARE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL RETORNO

Información General del Proceso		
Tipo de Proceso	Licitación obra pública	
Estado del Proceso	Celebrado	
Asociado al Acuerdo de Paz	Si	
Punto del Acuerdo de Paz	Punto 1. Reforma Rural Integral	
Pilar del Acuerdo de Paz	1.5. Desarrollo social: Vivienda y Agua Potable	
Documentos tipo	Si	
Sector	Sector de agua potable y saneamiento básico	
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación	
Grupo	[F] Servicios	
Segmento	[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	
Familia	[8110] Servicios profesionales de ingeniería	
Clase	[811015] Ingeniería civil	
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CALAMAR, EL RETORNO Y SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	
Cuantía a Contratar	\$ 3,699,317,666.42	
Moneda de Pago	Peso Colombiano	
Tipo de Contrato	Obra	
Tipo de Gasto	Inversión	
Códigos BPIN	Código	Año
	2021005950135	2021

Pantallazo tomado del proceso contractual en el secop, noviembre 2023. (Fuente propia)

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
-----	----------	--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	----------------

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE****INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023**

21	Subsidiar al 100% de usuarios de estratos 1,2 y 3 de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	Porcentaje de usuarios de estratos 1, 2 y 3 subsidiados	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	100%	100%
----	--	---	--	---	------	------

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio durante cada vigencia la entidad suscribió los respectivos contratos y convenios para la trasferencia de recursos a las empresas prestadoras del servicio de Acueducto, alcantarillado y aseo según el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos destinados para sufragar los subsidios.

Retos**Recomendaciones**

- Tramitar los convenios y contratos interadministrativos desde el mes de enero de cada vigencia.

Evidencias:

- Convenios y contratos suscritos con Empoaguas y Ambientar desde la vigencia 2020 a la vigencia 2024, para el giro mensual de los recursos por concepto de subsidios a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
22	Transferencias de recursos al PDA	Porcentaje de recursos transferidos (según convenio 001 de 2009)	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	100%	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta el municipio durante cada vigencia (2020 a 2023) la entidad suscribió los respectivos pagos por resolución para la trasferencia de los recursos según convenio 001 de 2009.

Mediante acuerdo 025 de diciembre de 2022 el municipio amplió su participación como aportante al PDA hasta la vigencia 2028.

Retos

- Presentar proyectos del sector agua potable y saneamiento básico ante PDA y Minvivienda para poder hacer uso de los recursos de la bolsa.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Recomendaciones

- No apalancar más consultorías con recursos del aporte de la entidad, y solicitar el estado actual de las que se han desarrollado con ese mecanismo.

Evidencias:

- Acuerdo 025 de diciembre de 2022, por medio del cual se modifica el acuerdo no. 022 de 2009.

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA

2.1. Programa: Vías e Infraestructura con Oportunidad y Progreso para Todos

Recursos Financieros: Detalle financiero de los recursos utilizados para cumplimiento de las metas de este programa por vigencia. (Recursos Ejecutados y en ejecución)

Tabla 3. Recursos Ejecutados Vías e Infraestructura con Oportunidad y Progreso para Todos

Fuente /Año	2020	2021	2022	2023	Total
Cof. Departamento					\$0,00
Cof.Nación		\$900.000.000,00	\$900.000.000,00		\$1.800.000.000,00
Crédito		\$6.272.000.000,00	\$1.486.793.010,13		\$7.758.793.010,13
Otros		\$22.982.201,00		\$459.177.057,00	\$482.159.258,00
R.P. Con Destinación Específica	\$500.000.000,00	\$584.544.813,00	\$647.920.535,00	\$600.000.000,00	\$2.332.465.348,00
Recursos Propios Art 7°	\$507.057.671,84	\$802.850.700,50	\$561.211.955,52	\$951.700.000,00	\$2.822.820.327,86
SGP Alim. Escolar					\$0,00
SGP APSB					\$0,00
SGP Cultura					\$0,00
SGP Deportes					\$0,00
SGP Educación					\$0,00
SGP Libre Destinación		\$661.594.815,94	\$225.484.249,00		\$887.079.064,94
SGP Libre Inversión	\$333.506.500,75		\$496.146.117,07	\$50.000.000,00	\$879.652.617,82
SGP Salud					\$0,00
Regalías		\$833.781.554,06			\$833.781.554,06
SGP Libre Destinación 4,5,Y 6 Categoría				\$929.090.206,16	\$929.090.206,16
Total	\$1.340.564.172,59	\$10.077.754.084,50	\$4.317.555.866,72	\$2.989.967.263,16	\$18.725.841.386,97

Tabla 4. Recursos en Ejecución Vías e Infraestructura con Oportunidad y Progreso para Todos

Fuente /Año	2020	2021	2022	2023	Total
Cof. Departamento					\$0,00
Cof.Nación					\$0,00
Crédito			\$97.605.290,00		\$97.605.290,00
Otros				\$303.523.520,00	\$303.523.520,00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

R.P. Con Destinación Específica					\$0,00
Recursos Propios Art 7°				\$348.107.031,71	\$348.107.031,71
SGP Alim. Escolar					\$0,00
SGP APSB					\$0,00
SGP Cultura					\$0,00
SGP Deportes					\$0,00
SGP Educación					\$0,00
SGP Libre Destinación					\$0,00
SGP Libre Inversión				\$8.200.000,00	\$8.200.000,00
SGP Salud					\$0,00
Regalías					\$0,00
SGP Libre Destinación 4,5,Y 6 Categoría				\$50.483.534,87	\$50.483.534,87
Total	\$0,00	\$0,00	\$97.605.290,00	\$710.314.086,58	\$807.919.376,58

Metas del Programa

Nota: Cree una sección por cada meta del programa.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente Responsable -	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
1	Vía terciaria mejorada	Metros lineales de placa huella construida	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	1.000	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta la entidad se valió de la gestión ante entidades de orden nacional aprovechando los diferentes programas del gobierno. Para ello se suscribieron 2 convenios como se relaciona a continuación:

- Convenio 1920 de 2020 - Cuyo objeto es Anuar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS y el municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa Colombia rural tramo Nuevo Tolima-Alpes-Cerro Azul.

Derivado del proceso anterior se suscribe el contrato de obra 401 de 2022, cuyo objeto comprende CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA NUEVA TOLIMA - CARACOL - LOS ALPES - CERRO AZUL DEL PREGRAMA COLOMBIA RURAL "EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE", actualmente en ejecución. Con este se realizó la construcción de 475 metros lineales de placa huella, Construcción de obras para la estabilización puente Caño Yamú y Mantenimiento rutinario del corredor.

- Convenio FP- 354 de 2021 - Celebrar un Convenio Interadministrativo entre el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ- FONDO PAZ Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE, con el fin de aunar esfuerzos, recursos y capacidades para apoyar el desarrollo y la implementación de los proyectos propuestos por el Municipio del San José del Guaviare, dentro de las funciones asignadas a la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento.



De dicho convenio se logró la aprobación del proyecto denominado: “Mejoramiento de la vía que conduce desde la vereda Nuevo Tolima a la vereda Cerro Azul del municipio de San José del Guaviare, del departamento del Guaviare.” Y con este se logrará ejecutar: 870 metros lineales de placa huella y 9 obras de arte para drenaje manejo de aguas lluvias.

Por otro lado, es importante mencionar que con el apoyo del Departamento se logró la intervención mediante la construcción de placa huella en la vía Tranquilandia y la Vía a Playa Guío.


Retos

- Dar cumplimiento a lo establecido en el plan vial municipal, e Implementar obras de mejoramiento y solución en los puntos críticos de los corredores del plan vial, mediante la inversión de recursos propios y recursos de la nación aprovechando las convocatorias y diferentes fuentes de financiación.
- Seguir mejorando la movilidad en cada uno de los ejes estratégicos del municipio (Agrícolas, Pecuarios y turísticos)

Recomendaciones

- Apoyar las comunidades o juntas de acción comunal que se postularon al programa Caminos Comunitarios para la Paz Total a fin de logra de manera articulada la gestión y ejecución de los proyectos.
- Realizar las intervenciones en los carreterales de acuerdo a las prioridades establecidas en el plan vial municipal. Así mismo realizar el seguimiento y/o retomar los proyectos viales rurales presentados a los diferentes mecanismos de financiación.

Evidencias: Registro Fotográfico y/o mencione que otro tipo de evidencia respalda las actividades realizadas. (Describa claramente cada evidencia)

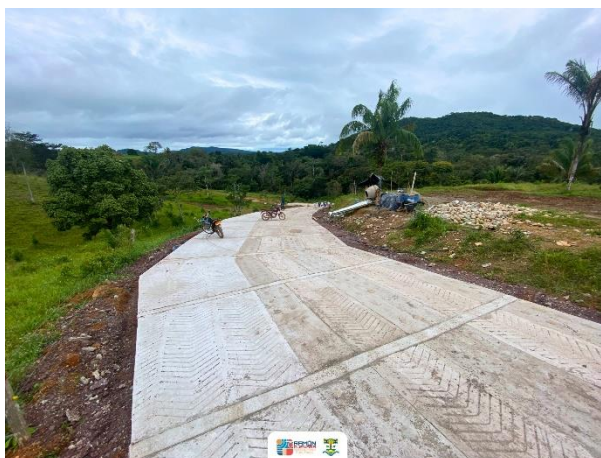

Registro fotográfico visita de obra proyecto placa huellas contrato 401 de 202, vereda Los Alpes, junio de 2023.




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico visita de obra proyecto mejoramiento vial puntos críticos, placa huella y Box culvert triple, vereda Los Alpes, enero de 2023.

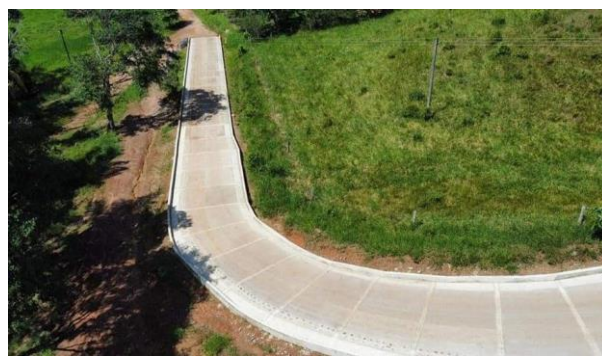

Registro fotográfico panorámica obra proyecto mejoramiento vial puntos críticos, placa huellas, vereda Los Alpes, enero de 2023.

No.	Producto	Meta Producto -	Fuente Responsable -	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
2	Kilómetro de Vía terciaria priorizadas con concepto ambiental favorable	Km de Vía terciaria priorizada con mantenimiento	Secretaría de Obras Públicas Municipal	272	272	100%

Actividades realizadas

VIGENCIA 2020

El Municipio logró realizar el mantenimiento periódico a 114.5 kilómetros de red vial terciaria, con la maquinaria del municipio, beneficiando la población en general que hace uso de estas vías.

Puerto Tolima, Playa guio – Laguna Negra, Dorado – Refugio, Leona – Simón Bolívar, Tigre – Vía, Turpial, Boquerón – Vía Caño Blanco 2, Florida 2, R.I. Refugio – Santo Domingo, Altos de San Jorge, Caracol – Triunfo 2, Carpa – Orquídeas, Refugio – Caracol, Barrancón Bajo, Santa Lucía (Desplazados), San Cristóbal – Placa huella, Tienda Nueva – San Cristóbal, Mata de Bambú – Ganadera, Guacamayas –



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Gaviotas, Gaviotas – Naranjales, Naranjales – La Dos Mil, Santa Rita – Aproxes, Tienda Nueva – Caño Blanco II, Trocha la Ganadera – Basurero.

Para lo anterior en la vigencia 2020 se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios para la operación de maquinaria, ayudantes de maquinaria, suministro de repuestos, combustible y alquiler de maquinaria: 42, 43, 71, 116, 142, 152, 202, 211, 232, 257, 258, 285, 318, 320, 154, 169, 174, 393.

VIGENCIA 2021

Mantenimiento a vías terciarias del corregimiento Boquerón en las veredas: Centro Poblado Boquerón (trazado Calles), San Luis de los Aires, Gualandayes, San Luis, El infierno, Naranjales, Gaviotas, Aproxche, Puente San Cristóbal, Alcantarilla Simón Bolívar, Santa Rosa, Puerto Ospina. Se entregaron tubos en concreto, Santa Rosa, La Abeja.

Mantenimiento a vías terciarias del corregimiento El Capricho en las veredas: Cerro Azul, Carpa, Orquídeas, Dorado, Tres Tejas, Rosales, Manantiales, Caño Pescado, Caño Lajas, La Tortuga.

En el municipio Zona Rural
El Retiro, Playa Guio, Puerto Tolima, Santo Domingo, Leona, Acacias.

En la vigencia 2021 se atendieron 135 km, y se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios para la operación de maquinaria, ayudantes de maquinaria, suministro de repuestos, combustible y alquiler de maquinaria: 065-2021, 269-2021, 227-2021, 292-2021, 168-2021, 307-2021, 256-2021, 006-2021, 318-2021, 334-2021, 034-2021, 016-2021, 037-2021, 294-2021, 017-2021, 319-2021, 044-2021, 335-2021, 048-2021, 050-2021, 170-2021, 225-2021, 078-2021, 201-2021, 060-2021, 225-2021, 068-2021, 320-2021, 325-2021, 140-2021, 169-2021.

VIGENCIA 2022

Mantenimiento a vías terciaria sector Trocha Ganadera: Santa Rosa, La Abeja, La Oriental, San Cristóbal, Puerto Ospina, San Francisco, Santa Cecilia, Santa Lucía, Guacamayas, Nueva Colombia, Campo Alegre.

Mantenimiento a vías terciarias del corregimiento El Capricho en las veredas: Tres tejas, Milenio, Alpes, Nueva Tolima, Capricho, Dorado.

En el municipio Zona Rural: RI Refugio, RI la María, Agua Bonita, Bocas de Agua bonita, Altos de San Jorge.

En la vigencia 2022 se lograron intervenir 100 kilómetros aproximadamente, y se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios para la operación de maquinaria, ayudantes de maquinaria, suministro de repuestos, combustible y alquiler de maquinaria: 35, 36, 42, 55, 60, 78, 88, 140, 160, 208, 225, 235, 245, 248, 249, 252, 253, 254, 255, 295, 296, 302, 304, 305, 326, 339, 363.

VIGENCIA 2023

Corregimiento Boquerón sector Trocha Ganadera: Santa Rita, La Oriental, San Cristóbal, Nueva Granada, Guacamayas, Nuevo Milenio, Naranjales, Puerto Ospina. Las Acacias.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Corregimiento Capricho: Refugio, Carpa, Dorado, Orquídeas, Caño Flauta, La Rompida, Milenio, Caracol,

En zona rural, Altos de San Jorge, Agua Bonita.

En este periodo se continúa trabajando, se han atendido más de 100 km en el denominado plan verano, postreramente se atienden emergencias y puntos críticos.

A la fecha se han suscrito los siguientes contratos: 17, 34, 37, 51, 52, 54, 63, 69, 76, 80, 81, 139, 140, 144, 206, 264, 265, 267, 270, 274, 439, 440

Retos

- Garantizar condiciones de movilidad seguras, optimas y persistentes en el tiempo, durante los 12 meses del año, en los corredores enmarcados en el plan vial municipal, de tal manera que es necesario implementar acciones de mejoramiento vial que contemplen utilización de nuevos materiales y obras de infraestructura para el manejo de las aguas lluvias.

Recomendaciones

- En cada vigencia, presentar ante la corporación ambiental, el plan de adaptación a la guía ambiental, previo a la intervención de los corredores a fin de evitar impactos ambientales negativos.
- Establecer cronogramas de trabajo concertados con la comunidad y articulados con el departamento.
- Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque automotor de la dependencia, e incluir dentro de este un vehículo que permita el transporte de la maquinaria amarilla.
- Aplicar materiales con características de durabilidad o en su efecto material de planta que garantice condiciones de estabilidad y seguridad.

Evidencias: Registro Fotográfico y/o mencione que otro tipo de evidencia respalda las actividades realizadas. (Describa claramente cada evidencia)

Ejemplo Registro Fotográfico:



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico mantenimiento preventivo maquinaria amarilla cambio de filtros, Patio obras Publicas, Tomada en enero de 2020.



Registro fotográfico mantenimiento vial rural, sector corregimiento Boquerón Tomada en junio de 2020.



Registro fotográfico mantenimiento vial rural, sector Puerto Tolima, Tomada en junio de 2020.




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico mantenimiento vial rural, sector Puerto Arturo, Tomada en enero de 2021.

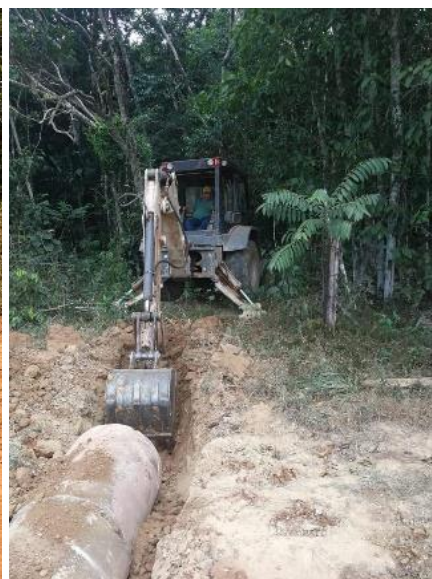

Registro fotográfico mantenimiento vial rural, sector Caracol-Nuevo Milenio, Tomada en marzo de 2021.



Registro fotográfico mantenimiento vial rural, sector Puerto Ospina, Tomada en abril de 2021.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico mantenimiento vial rural, sector Capricho La Carpa, Tomada en diciembre de 2022.



Registro fotográfico mantenimiento vial rural, sector Vereda Dorado, Tomada en enero de 2023.



Registro fotográfico mantenimiento vial rural, sector Santa Rita, Tomada en enero de 2023.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Metas del Programa

Nota: Cree una sección por cada meta del programa.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
3	Documento estratégico de inventario vial	Documento de gestión del Inventario Vial	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	1	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta la entidad realizó la gestión ante el ministerio de transporte, quienes efectuaron la consultoría en el marco del proceso “CARACTERIZACIÓN DE VÍAS TERCARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA, ANTIOQUIA, MAGDALENA, LA GUAJIRA, BOLÍVAR, CESAR Y GUAVIARE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ”.

Retos

- De acuerdo con la caracterización vial, es importante identificar las mayores necesidades en infraestructura de transporte en área rural, y de esta manera priorizar las inversiones a fin de lograr mejorar las condiciones de conectividad.

Recomendaciones

- Revisar la información y/o productos de la consultoría de caracterización vial.
- Realizar actualización del plan vial municipal donde se deberá ajustar información relacionada con conceptos ambientales, inclusión y exclusión de algunos tramos.
- Seguir con la gestión de formalización de carreteras ante el ministerio de transporte.

Evidencias:

Resolución no. del ministerio de transporte de octubre de 2023 "Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Municipio de San José del Guaviare, Departamento de Guaviare”.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
4	Vía rural y/o urbana mejorada	Obras de arte gestionadas y construidas	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	20	100%

Actividades realizadas



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Para el cumplimiento de esta meta la entidad se valió de la gestión ante entidades de orden nacional aprovechando los diferentes programas del gobierno, y la inversión de recursos para la construcción de alcantarillas como se relaciona a continuación:

- Convenio FP- 354 de 2021 - Celebrar un Convenio Interadministrativo entre el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ- FONDO PAZ Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE, con el fin de aunar esfuerzos, recursos y capacidades para apoyar el desarrollo y la implementación de los proyectos propuestos por el Municipio del San José del Guaviare, dentro de las funciones asignadas a la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento.

De dicho convenio se logró la aprobación del proyecto denominado: “Mejoramiento de la vía que conduce desde la vereda Nuevo Tolima a la vereda Cerro Azul del municipio de San José del Guaviare, del departamento del Guaviare.” Y con este se logrará ejecutar: 870 metros lineales de placa huella y 9 obras de arte para drenaje manejo de aguas lluvias (Box, alcantarillas y pontones).

- CONTRATO 402 -2020. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TUBOS EN CONCRETO CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE. Suministro de tubos en concreto para la realización de 20 alcantarillas artesanales.
- CONVENIO ACUERDO No. 2307925 FAO – DEISPAZ MEDIANTE EL CUAL SE CONSTRUYERON 13 ALCANTARILLAS EN LA VIA CARACOL - REFUGIO.
- Contrato 168-2021 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TUBOS EN CONCRETO CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. Suministro de tubos en concreto para la realización de 20 alcantarillas artesanales.
- CONTRATO 168-2023 - CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TUBOS EN CONCRETO CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. Suministro de tubos en concreto para la realización de 20 alcantarillas artesanales.

Retos

- Ejecutar obras para el manejo de agua lluvia en las vías en coordinación y concertación con las juntas de acción comunal a fin de priorizar puntos críticos de los ejes viales inmersos en el plan vial municipal.

Recomendaciones

- Se recomienda concertar con las comunidades la ubicación de los puntos más críticos para la ejecución de proyectos viales. Así mismo es necesario que se tenga en cuenta los criterios de priorización establecidos en el plan vial municipal.

Evidencias:

Registro fotográfico.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico mantenimiento vial rural, construcción de alcantarilla sector Boquerón, Tomada en enero de 2021.



Registro fotográfico mantenimiento vial rural, construcción de alcantarilla sector Arazá, Tomada en agosto de 2020.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico visita de obra proyecto mejoramiento vial puntos críticos, placa huella y Box culvert triple, vereda Los Alpes, enero de 2023.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
5	Gestión y/o ejecución mejoramiento de vías terciarias	km de vía terciaria mejorada gestionados y/o ejecutados	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	20	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta la entidad se valió de la gestión ante entidades de orden nacional aprovechando los diferentes programas del gobierno. Para ello se suscribieron 2 convenios como se relaciona a continuación:

- Convenio 1920 de 2020 - Cuyo objeto es Anuar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS y el municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa Colombia rural tramo Nuevo Tolima-Alpes-Cerro Azul.

Derivado del proceso anterior se suscribe el contrato de obra 401 de 2022, cuyo objeto comprende CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA NUEVA TOLIMA - CARACOL - LOS ALPES - CERRO AZUL DEL PREGRAMA COLOMBIA RURAL "EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE", actualmente en ejecución. Con este se realizó la construcción de 475 metros lineales de placa huella, Construcción de obras para la estabilización puente Caño Yamú y Mantenimiento rutinario del corredor.

- Convenio FP- 354 de 2021 - Celebrar un Convenio Interadministrativo entre el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ- FONDO PAZ Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE, con el fin de aunar esfuerzos, recursos y capacidades para apoyar el desarrollo y la implementación de los proyectos propuestos por el Municipio del San José del Guaviare, dentro de las funciones asignadas a la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

De dicho convenio se logró la aprobación del proyecto denominado: “Mejoramiento de la vía que conduce desde la vereda Nuevo Tolima a la vereda Cerro Azul del municipio de San José del Guaviare, del departamento del Guaviare.” Y con este se logrará ejecutar: 870 metros lineales de placa huella y 9 obras de arte para drenaje manejo de aguas lluvias.

Retos

- Dar cumplimiento a lo establecido en el plan vial municipal, e Implementar obras de mejoramiento y solución en los puntos críticos de los corredores del plan vial, mediante la inversión de recursos propios y recursos de la nación aprovechando las convocatorias y diferentes fuentes de financiación.
- Seguir mejorando la movilidad en cada uno de los ejes estratégicos del municipio (Agrícolas, Pecuarios y turísticos)

Recomendaciones

- Apoyar las comunidades o juntas de acción comunal que se postularon al programa Caminos Comunitarios para la Paz Total a fin de logra de manera articulada la gestión y ejecución de los proyectos.
- Realizar las intervenciones en los carreterales de acuerdo a las prioridades establecidas en el plan vial municipal. Así mismo realizar el seguimiento y/o retomar los proyectos viales rurales presentados a los diferentes mecanismos de financiación.

Evidencias: Registro Fotográfico y/o mencione que otro tipo de evidencia respalda las actividades realizadas. (Describa claramente cada evidencia)



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico antes y después de la construcción de placa huellas contrato 401 de 202, vereda Los Alpes, junio de 2023.



Registro fotográfico construcción de placa huellas contrato 401 de 202, vereda Los Alpes, junio de 2023



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico panorámica obra proyecto mejoramiento vial puntos críticos, Box sencillo y Box triple, vereda Los Alpes, enero de 2023.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
6	Proyecto de gestión y construcción de alumbrado público en zona rural y/o urbana	Número de proyectos de alumbrado público en zona urbana y/o rural gestionado y construido	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	3	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta la entidad apropió los recursos del SGR, formuló los proyectos para la modernización del sistema de alumbrado público de la zona urbana de la siguiente manera:

- Modernización del sistema de alumbrado público segunda etapa en el municipio de San José Del Guaviare Departamento del Guaviare, BPIN 2020950010052. Ejecutado.
- Modernización del sistema de alumbrado público tercera etapa en el municipio de San José Del Guaviare Departamento del Guaviare, BPIN 2022950010057. En ejecución.
- Modernización del sistema de alumbrado público cuarta etapa en el municipio de San José Del Guaviare Departamento del Guaviare, BPIN 2023950010040. En ejecución.
- Modernización del sistema de alumbrado público quinta etapa en el municipio de San José Del Guaviare, BPIN 2023950010045. Formulado y presentado.

Para la materialización de los proyectos se determinó como ejecutar a la empresa de energía eléctrica Enenguaviare.

Retos



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

- Completar la modernización del sistema de alumbrado público en la zona urbana del municipio, y garantizar la AOM, y sostenimiento.

Recomendaciones

- Adquirir la dotación técnica e instrumental necesaria para el mantenimiento rutinario y preventivo al sistema de alumbrado público modernizado (led) de tal manera que se logre una correcta AOM.
- Realizar y actualizar el inventario o catastro del sistema de alumbrado público del municipio.

Evidencias: Registro Fotográfico y/o mencione que otro tipo de evidencia respalda las actividades realizadas. (Describa claramente cada evidencia)



Registro fotográfico Instalación de luminarias del proyecto de modernización del sistema de alumbrado público, etapa 2, Zona urbana Divino niño y Porvenir, enero de 2022.



Registro fotográfico Instalación de luminarias del proyecto de modernización del sistema de alumbrado público, etapa 2, Zona urbana Modelo y Porvenir, enero de 2022.



Registro fotográfico Instalación de postes del proyecto de modernización del sistema de alumbrado público, etapa 3, Zona urbana Modelo y Porvenir, septiembre de 2023.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE****INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023**

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
7	Mantenimiento del alumbrado publico	Porcentaje de alumbrado público con mantenimiento	Secretaría de Obras Públicas Municipal	80%	80%	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta la entidad apropio los recursos para la adquisición de elementos eléctricos de alumbrado público y contratación de personal para mantener operativo el sistema de alumbrado público en un 80% en la zona urbana, adicionalmente se realizaron intervenciones en la zona rural, con los siguientes procesos:

VIGENCIA 2020

Se suscribieron los contratos de prestación de servicios 11, 78, 191, 213 y contrato de suministro No.408, y se realizaron las siguientes intervenciones:

Con el proyecto de mantenimiento y mejoramiento del sistema de alumbrado, el Municipio de San José del Guaviare realizó el mantenimiento del sistema de alumbrado público que se encontraba en mal estado y con frecuentes fallas por el uso de redes compartidas con las redes domiciliarias lo cual genera variación constante en la red y daños en los componentes de las luminarias, realizó contratación de personal compuesto por un (1) técnico para la reparación y mantenimiento del sistema de alumbrado público y una (1) persona para recepción, sistematización y programación de la atención y oportuna respuesta a las peticiones, quejas y reclamos y que apoye al técnico eléctrico en las actividades de mantenimiento y reparación, donde se ha logrado mantener en funcionamientos los siguientes barrios:

BARRIO	% DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE 2020
20 DE JULIO	75%
PIRAQUIVE	20%
CENTRO	60%
1 DE OCTUBRE	30%
PROVIDENCIA	35%
PORVENIR	45%
MODELO	35%
ESPERANZA	75%
VILLA DEL PRADO	85%
ARAZA	85%
COMUNEROS	40%
1 DEMAYO	50%
EL PROGREGIO	35%
BELLO HORIZONTE	80%
EL POPULAR	50%
DIVINO NIÑO	65%
COOPSAGUA	80%
EL REMANSO	50%
SANTANDER	80%



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

LA GRANJA	70%
EL TRIUNFO	30%
SUEÑOS DE PROSPERIDAD	90%
EL DORADO	45%
PRADOS DE SAN SEBASTIAN	60%
BICENTENARIO 1	50%
BICENTENARIO 2	50%
LA PAZ	50%
VILLA ANDREA	45%
SAN JORGE 1	80%
SAN JORGE 2	50%
SANTA ROSITA	50%
BELEN DE LA PAZ	80%
SAN IGNACIO	50%

VIGENCIA 2021

Para el mantenimiento y operación del 80% del sistema de alumbrado público se suscribieron los siguientes contratos: 7-2021, 18-2021, 51-2021, 53-2021, 192-2021, 279-2021, 280-2021, 288-2021 y se ejecutó lo siguiente:

- Mantenimiento y puesta en funcionamiento al 80% del sistema de alumbrado público urbano del municipio de San José del Guaviare
- Ampliación y mejoramiento de alumbrado público en zona rural (Capricho, Resbalón, Mirolindo, Puerto Arturo, Raudal, Santo Domingo)
- Cambio de sistema de alumbrado antiguo a luminaria Led
- Recuperación del alumbrado público en polideportivos, parques, zonas verdes e instalaciones institucionales.
- Instalación de alumbrado navideño.
- Mantenimiento al sistema eléctrico de algunas instalaciones de la administración municipal.

VIGENCIA 2022

Para el mantenimiento y operación del 80% del sistema de alumbrado público se suscribieron los siguientes contratos: 047 de 2022, 048 de 2022, 077 de 2022, 299 de 2022, 301 de 2022, 337 de 2022 para ejecutar lo siguiente

- Mantenimiento y puesta en funcionamiento al 80% del sistema de alumbrado público urbano del municipio de San José del Guaviare
- Ampliación y mejoramiento de alumbrado público en zona rural (Santo Domingo, La Carpa, Colinas)
- Atención de escenarios deportivos.

VIGENCIA 2023

A la fecha se han suscrito en esta vigencia los siguientes contratos: 63, 74, 285 y 329 y se vienen adelantando intervenciones para mantener el alumbrado público urbano en un 80%.

Retos



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

- Completar la modernización del sistema de alumbrado público en la zona urbana del municipio, y garantizar la AOM, y sostenimiento.

Recomendaciones

- Adquirir la dotación técnica e instrumental necesaria para el mantenimiento rutinario y preventivo al sistema de alumbrado público modernizado (led) de tal manera que se logre una correcta AOM.
- Realizar y actualizar el inventario o catastro del sistema de alumbrado público del municipio.

Evidencias: Registro Fotográfico y/o mencione que otro tipo de evidencia respalda las actividades realizadas. (Describa claramente cada evidencia)



Registro fotográfico mantenimiento al sistema de alumbrado público, Zona urbana, tomada en diciembre de 2022.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico mantenimiento al sistema de alumbrado público, recuperación zonas verdes, Zona urbana Glorieta Monumento al colono, tomada en diciembre de 2020.



Registro fotográfico Inauguración alumbrado navideño, tomada en diciembre de 2020.



Registro fotográfico Inauguración alumbrado navideño, tomada en diciembre de 2020



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico mantenimiento al sistema de alumbrado público, recuperación escenarios deportivos, tomada en noviembre de 2021.



Registro fotográfico mantenimiento al sistema de alumbrado público, cambio de luminarias y podas, tomada en noviembre de 2021.



Registro fotográfico aéreo sistema de alumbrado público, tomada en enero de 2022.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
8	Proyecto de implementación de sistemas de energía fotovoltaica en el área urbana y/o rural	Proyecto de implementación de sistemas de energía fotovoltaica en el área urbana y/o rural	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	2	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta la entidad se valió de la gestión ante entidades de orden nacional aprovechando los diferentes programas del gobierno. Para ello se suscribieron 2 procesos como se relaciona a continuación:

- Convenio FP- 354 de 2021 - Celebrar un Convenio Interadministrativo entre el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ- FONDO PAZ Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE, con el fin de aunar esfuerzos, recursos y capacidades para apoyar el desarrollo y la implementación de los proyectos propuestos por el Municipio del San José del Guaviare, dentro de las funciones asignadas a la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento.

De dicho convenio se logró la aprobación del proyecto denominado: “Construcción de polideportivos cubierto en las veredas **Puerto Cachicamo** y la **Carpa**.” Los cuales para su funcionamiento del sistema eléctrico se abastecen de energía fotovoltaica.

- Contrato 387 de 2022: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA PARA EL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE LA CARPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.

El proyecto contemplo la construcción de un sistema fotovoltaico para la alimentación de la red eléctrica de servicio general e iluminación.

Retos

- Implementar soluciones fotovoltaicas para los escenarios deportivos, parques, zonas verdes e incluso alumbrado público tanto en la zona urbana como rural a fin de disminuir costos operáticos en la prestación del servicio de alumbrado público.

Recomendaciones

- En los proyectos del área rural se recomienda la incorporación de un sistema foto voltaico para que estas infraestructuras sean auto suficientes y sostenibles.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Evidencias: Registro Fotográfico y/o mencione que otro tipo de evidencia respalda las actividades realizadas. (Describa claramente cada evidencia)



Registro fotográfico polideportivo y sobre la cubierta paneles sistema fotovoltaico, vereda La Carpa, abril de 2022.



Registro fotográfico cuarto eléctrico (banco de baterías) y polideportivo cubierto, vereda Puerto Cachicamo, julio de 2022.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico batería sanitaria polideportivo la Carpa, vereda La Carpa, enero de 2023.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente Responsable -	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
9	Mantenimiento de vías pavimentadas	Kilómetros de vías pavimentadas con mantenimiento	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	10	50%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, se realizó en conjunto con la secretaria de transito el proceso de señalización, instalación de señales y demarcación vial en la zona urbana. La administración municipal, se proyectó mejorar la regulación del tránsito y prevenir la accidentalidad, en calles, carreteras y ciclo rutas, con el propósito de generar un ambiente ágil, seguro y eficiente para los usuarios, en su movilización por las vías públicas, mediante la construcción de señalización vial, el mejoramiento de la señalización ya existente, así como la demarcación de zonas escolares y la construcción de separadores.

Por la anterior mediante la suscripción del Contrato de obra No. 316 de 2021, se contrató la construcción e instalación de la señalización vial, realizando las siguientes actividades:

- Construir e instalar la señalización vertical y horizontal de acuerdo a las especificaciones descritas en el Manual de Señalización Vial de 2015 del Ministerio de Transporte y adoptado mediante Resolución 0001885 de 2015.
- Demarcación con pintura en plástico en frío, construcción de bandas alertadoras y la instalación de hitos y tachones.

Las actividades se desarrollaron en las siguientes intercesiones:



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

- Intersección vial Calle 14 con Carrera 28.
- Intersección vial Calle 6 con Carrera 22.
- Intersección vial Calle 10 con Carrera 28
- Carrera 20 con Transversal 20
- Separador vial de la Carrera 20 con calle 22
- Separador vial de la Carrera 20 con calle 26
- Construcción de 7 bandas reductoras de velocidad, ubicadas en diferentes intercesiones viales.
- Demarcación zonas escolares.

Así mismo, en el marco de la ejecución de las obras de pavimentación de las vías del Municipio de San José del Guaviare e igualmente bajo la figura de donación de algunas Empresas privadas de la zona urbana de San José del Guaviare, se realizó la estación de 11 reductores de velocidad en diferentes zonas de alto riesgo de accidentalidad.

Retos

- Mejorar la movilidad y seguridad en las vías mediante la construcción, mantenimiento y adecuación de la señalización tanto horizontal como vertical.
- Poner en funcionamiento la red semafórica del casco urbano del municipio.

Recomendaciones

- Solicitar y exigir que los proyectos de infraestructura vial liderados por el departamento incluyan entre sus componentes el capítulo de la señalización de acuerdo a la normatividad vigente.
- Realizar la reparación de las vías o tramos de vías pavimentadas que se encuentran en mal estado a fin de prevenir o disminuir la tasa de accidentalidad.

Evidencias: Registro fotográfico Contrato de obra No. 316 de 2023, informe de actividades e informe de supervisión.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico señalización horizontal y vertical en zona escolar, vereda Capricho y colegio Santander, diciembre 2022.



Registro fotográfico señalización horizontal y vertical zona urbana, diciembre 2022.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente Responsable	-	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
10	Vía urbana mejorada	Kilómetros de Vía urbana pavimentada	Secretaría de Obras Públicas Municipal		4	5	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, la entidad ejecuto los proyectos de pavimentación en concreto rígido tanto en centros poblados del área rural como en la zona urbana del municipio, adicionalmente implemento por administración la construcción de vías de bajo tráfico en pavimento articulado. También



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

fue designado por el SGR como interventor de un proyecto cuya ejecución se realizó en los municipios de San José del Guaviare, Calamar y Retorno. A continuación, se relacionan los proyectos:

- Contrato 332-2021 - Contratar la pavimentación en concreto rígido de la avenida principal del corregimiento el Capricho, municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, mediante este proyecto se pavimentaron 800 metros lineales en el Capricho.
- Contrato 265-2021 - Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al mejoramiento de vías urbanas en concreto hidráulico para los municipios de San José del Guaviare, el Retorno y Calamar, departamento del Guaviare. Mediante este contrato se intervino 3.8 kilómetros de vías en el área urbana en los sectores: en la calle 18 entre transversal 20 C y Carrera 29, calle 17 entre carreras 24 y 28, carrera 25 entre calles 18 y 22, calle 5 entre carrera 28 y puente de Panuré.
- Contrato 316-2021 - Contratar el suministro de materiales y elementos para construcción de vías urbanas en pavimento articulado rígido en el municipio de San José Del Guaviare. Mediante este proyecto construyeron 2.2 kilómetros de vía en pavimento articulado en los barrios bicentenario 1, Prados de San Sebastián, Belén de la Paz y Bicentenario 2. Actualmente se ejecuta otro proyecto en el sector de Belén de La Paz, Comcaja y el barrio Modelo en el SENA.

Retos

- Mejorar la movilidad y seguridad en las vías mediante la construcción de proyectos de infraestructura vial integrales, que contemplen en sus componentes, la señalización tanto horizontal como vertical, el manejo de las aguas lluvias, la recuperación y conservación del espacio público, y las obras de urbanismo necesarias para que sean proyectos accesibles.

Recomendaciones

- Formular el plan de pavimentación de vías urbanas teniendo en cuenta factores como conectividad, manejo de aguas lluvias, corredores estratégicos y demás elementos que permitan garantizar condiciones de movilidad y seguridad para todos los actores viales.
- Exigir al Departamento la concertación de los proyectos de infraestructura vial con la secretaria de planeación municipal y la secretaria de obras públicas municipales.

Evidencias: Registro fotográfico.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico Pavimentación avenida principal Corregimiento el Capricho, noviembre 2022.



Registro fotográfico Pavimentación avenida principal Corregimiento el Capricho, noviembre 2022.





Registro fotográfico Pavimentación Urbana sector Bello horizonte, noviembre 2022.



Registro fotográfico pavimento articulado, Preparación del terreno, sector SENA Modelo, octubre 2023.



Registro fotográfico pavimento articulado, Instalación del adoquín y elementos de confinamiento, sector SENA Modelo, octubre 2023.





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Registro fotográfico pavimento articulado, sello de juntas con arena, sector SENA Modelo, octubre 2023.



Registro fotográfico pavimento articulado, Nivel terminado sector Prados y Belén de la Paz, octubre 2022.



Registro fotográfico pavimento articulado, Nivel terminado sector Prados y Belén de la Paz, octubre 2022.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
11	Malla vial urbana sin pavimento con mantenimiento periódico	kilómetros de malla vial urbana sin pavimento mejorada anualmente	Secretaría de Obras Públicas Municipal	58,6	58,6	100%

Actividades realizadas



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Para cada vigencia, la entidad territorial logró mantener transitables los casi 60 kilómetros de red vial urbana, Importante destacar que debido a los altos volúmenes de tránsito diario, las constantes lluvias, la inexistencia de una fuente de material que garantice condiciones de durabilidad y consistencia y la poca maquinaria con la que cuenta la entidad, se debía realizar constantemente el mantenimiento a los puntos más críticos de la malla vial urbana.

VIGENCIA 2020

El Municipio logró realizarla intervención de los puntos críticos en el área urbana donde no se cuenta con pavimento, con la maquinaria del municipio, beneficiando la población en general que hace uso de estas vías.

Para lo anterior en la vigencia 2020 se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios para la operación de maquinaria, ayudantes de maquinaria, suministro de repuestos, combustible y alquiler de maquinaria: 42, 43, 71, 116, 142, 152, 202, 211, 232, 257, 258, 285, 318, 320, 154, 169, 174, 393.

VIGENCIA 2021

En la vigencia 2021 se atendieron los puntos más críticos de la malla vial urbana, y se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios para la operación de maquinaria, ayudantes de maquinaria, suministro de repuestos, combustible y alquiler de maquinaria: 065-2021, 269-2021, 227-2021, 292-2021, 168-2021, 307-2021, 256-2021, 006-2021, 318-2021, 334-2021, 034-2021, 016-2021, 037-2021, 294-2021, 017-2021, 319-2021, 044-2021, 335-2021, 048-2021, 050-2021, 170-2021, 225-2021, 078-2021, 201-2021, 060-2021, 225-2021, 068-2021, 320-2021, 325-2021, 140-2021, 169-2021.

VIGENCIA 2022

En la vigencia 2022 se lograron intervenir La mayor parte de los puntos críticos, y se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios para la operación de maquinaria, ayudantes de maquinaria, suministro de repuestos, combustible y alquiler de maquinaria: 35, 36, 42, 55, 60, 78, 88, 140, 160, 208, 225, 235, 245, 248, 249, 252, 253, 254, 255, 295, 296, 302, 304, 305, 326, 339, 363.

VIGENCIA 2023

En este periodo se continúa trabajando, se han atendido más de 20 km en el denominado plan verano, postreramente se atienden emergencias y puntos críticos.

A la fecha se han suscrito los siguientes contratos: 17, 34, 37, 51, 52, 54, 63, 69, 76, 80, 81, 139, 140, 144, 206, 264, 265, 267, 270, 274, 439, 440

Retos

- Garantizar condiciones de movilidad seguras, optimas y persistentes en el tiempo, durante los 12 meses del año, en el área urbana, de tal manera que es necesario implementar acciones de mejoramiento vial que contemplen utilización de nuevas fuentes de materiales.

Recomendaciones



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

- Establecer cronogramas de trabajo concertados con la comunidad y articulados con el departamento.
- Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque automotor de la dependencia, e incluir dentro de este un vehículo que permita el transporte de la maquinaria amarilla.
- Aplicar materiales con características de durabilidad o en su efecto material de planta que garantice condiciones de estabilidad y seguridad.

Evidencias: Registro Fotográfico y/o mencione que otro tipo de evidencia respalda las actividades realizadas. (Describa claramente cada evidencia)

Ejemplo Registro Fotográfico:



Registro fotográfico mantenimiento preventivo maquinaria amarilla cambio de filtros, Patio obras Publicas, Tomada en enero de 2020.



Registro fotográfico mantenimiento red vial urbana sin pavimento, sector Villa Andrea, Tomada en diciembre de 2021.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico mantenimiento red vial urbana sin pavimento, Tomada en diciembre de 2021.



Registro fotográfico mantenimiento red vial urbana sin pavimento, Tomada en diciembre de 2021.



Registro fotográfico mantenimiento red vial urbana sin pavimento, Tomada en diciembre de 2021.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico mantenimiento red vial urbana sin pavimento, vigencia 2020-2023.



Registro fotográfico mantenimiento red vial urbana sin pavimento, vigencia 2020-2023.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico mantenimiento red vial urbana sin pavimento, vigencia 2020-2023.



Registro fotográfico mantenimiento red vial urbana sin pavimento, vigencia 2020-2023.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico mantenimiento red vial urbana sin pavimento, vigencia 2020-2023.



Registro fotográfico mantenimiento red vial urbana sin pavimento, vigencia 2020-2023.

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
12	Proyecto de interconexión eléctrica que beneficia a 200 familias	Número de familias beneficiadas	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	200	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, la entidad ejecutó el proyecto de las obras complementarias de la subestación eléctrica de Boquerón, obra con la cual se pudo poner en funcionamiento el proyecto de interconexión eléctrica de este importante corregimiento, proyecto que no estaba operando desde que fue terminada la obra.

- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL BOQUERÓN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Retos


- Gestionar proyectos del sector de energético en articulación con la Empresa prestadora del servicio Energúaviare, que permitan ampliación y/o conexión del servicio en las veredas que se encuentran sin solución de energía eléctrica. Y para sectores dispersos proveer de energía foto voltaica.



Recomendaciones

- En los proyectos del área rural se recomienda la incorporación de un sistema foto voltaico para que estas infraestructuras sean auto suficientes y sostenibles.

Evidencias: Registro Fotográfico y/o mencione que otro tipo de evidencia respalda las actividades realizadas. (Describa claramente cada evidencia)

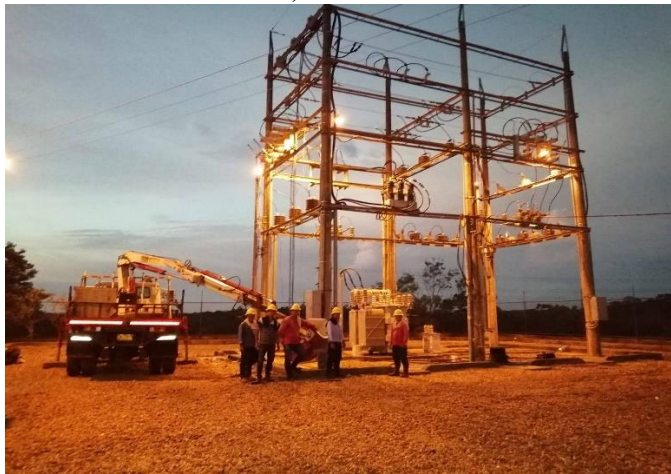

Registro fotográfico subestación eléctrica Boquerón en funcionamiento, noviembre 2020.



Registro fotográfico subestación eléctrica Boquerón y Modulo de salida subestación eléctrica San José del Guaviare, Instalación de equipos, octubre 2020.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE****INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023**

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente Responsable -	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
12	Materiales alternativos para estabilización de vías	Kms de Vías estabilizadas, mejoradas y adoquinadas	Secretaría de Obras Públicas Municipal	0	1	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, la entidad implemento por administración la construcción de vías de bajo tráfico en pavimento articulado. A continuación, se relacionan los proyectos:

- Contrato 316-2021 - Contratar el suministro de materiales y elementos para construcción de vías urbanas en pavimento articulado rígido en el municipio de San José Del Guaviare. Mediante este proyecto construyeron 2.2 kilómetros de vía en pavimento articulado en los barrios bicentenario 1, Prados de San Sebastián, Belén de la Paz y Bicentenario 2. Actualmente se ejecuta otro proyecto en el sector de Belén de La Paz, Comcaja y el barrio Modelo en el SENA.

Retos

- Mejorar la movilidad y seguridad en las vías mediante la construcción de proyectos de infraestructura vial integrales, que contemplen en sus componentes, la señalización tanto horizontal como vertical, el manejo de las aguas lluvias, la recuperación y conservación del espacio público, y las obras de urbanismo necesarias para que sean proyectos accesibles.

Recomendaciones

- Formular el plan de pavimentación de vías urbanas teniendo en cuenta factores como conectividad, manejo de aguas lluvias, corredores estratégicos y demás elementos que permitan garantizar condiciones de movilidad y seguridad para todos los actores viales.
- Exigir al Departamento la concertación de los proyectos de infraestructura vial con la secretaria de planeación municipal y la secretaria de obras públicas municipales.

Evidencias: Registro fotográfico.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico pavimento articulado, Instalación del adoquín y elementos de confinamiento, sector SENA Modelo, octubre 2023.




Registro fotográfico pavimento articulado, Nivel terminado sector Prados y Belén de la Paz, octubre 2022.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

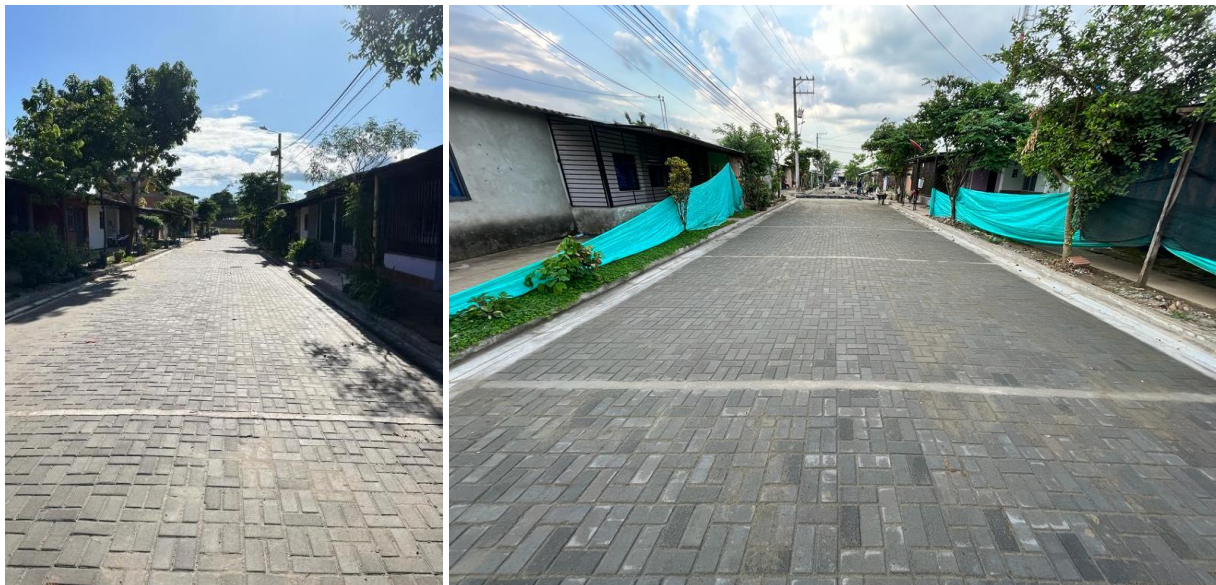

Registro fotográfico pavimento articulado, Nivel terminado sector Prados y Belén de la Paz, octubre 2022.

3. DIMENSIÓN SOCIAL – OTRAS DEPENDENCIAS

Oportunidad y Progreso para los Niños, Niñas y Adolescentes

No.	Producto	Meta - Producto	Fuente Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
2	Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Infantil y Hogar Agrupado para la atención integral a la Primera Infancia en el municipio de San José del Guaviare.	Número de centros de desarrollo infantil fortalecidos.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	4	4	75%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, la secretaria de obras públicas apoyo la formulación y ejecución de proyectos que permitieron poner en funcionamiento los CDI del área urbana del municipio correspondientes a San Jorge, Guadianés de la Selva y San Ignacio. Beneficiando de esta manera a los niños y niñas de la primera infancia e infancia.

A continuación, se relacionan los procesos:

Ejecución del contrato No. 416 de 2020 cuyo objeto corresponde a CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CDI SAN JORGE EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Ejecución del contrato No. 385 de 2021 cuyo objeto corresponde a CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL CDI GUARDIANES DE LA SELVA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.

Ejecución del contrato No. 360 de 2022 cuyo objeto corresponde a CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CDI GUARDIANES DE LA SELVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.

Retos

- Ampliar, conservar y mantener la infraestructura municipal para aumentar la capacidad de atención integral a la Primera Infancia.
- Garantizar recursos y proyectos para la atención integral a la Primera Infancia en el sector rural.

Recomendaciones

- Realizar el mantenimiento periódico de la infraestructura construida para evitar el deterioro de la misma.
- Garantizar vigilancia y/o custodia de la infraestructura para la atención de los niños y niñas a fin de evitar que sea vandalizada.
- Coordinar con el ICBF y/o operadores de esta entidad la gestión de recursos para invertir en la mejora de la infraestructura existente, así como el cumplimiento de la normatividad vigente

Evidencias:

- **Registro Fotográfico**

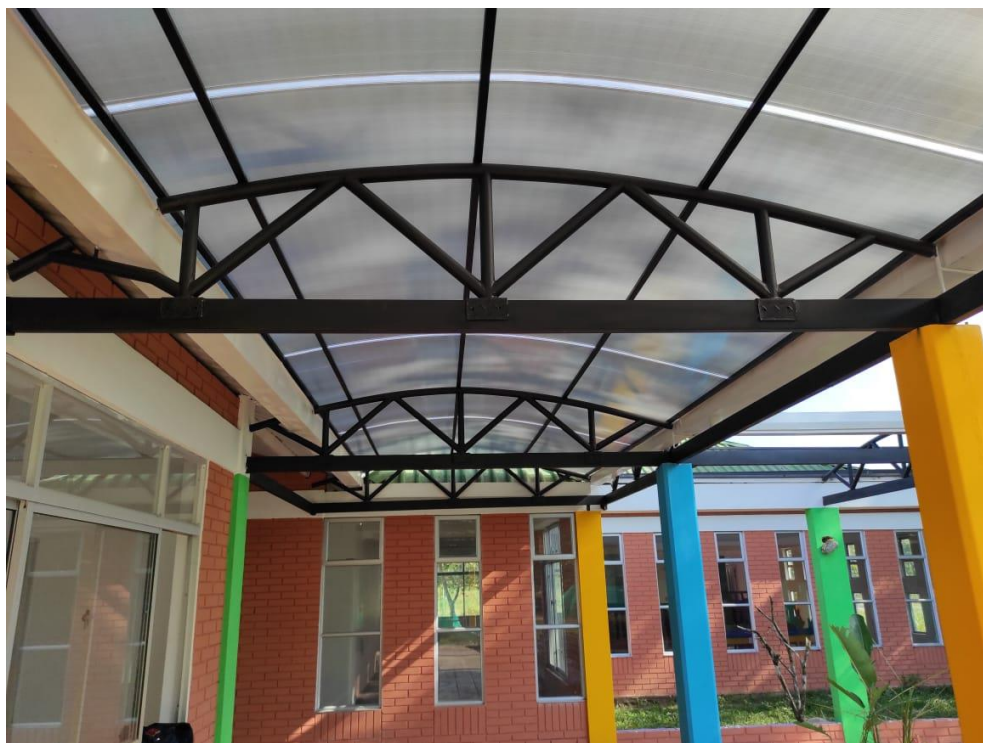


Imagen. Registro fotográfico acceso peatonal CDI San Jorge, tomada en enero de 2021 (Fuente propia).



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Imagen. Registro fotográfico batería sanitaria CDI San Jorge, tomada en enero de 2021 (Fuente propia).



Imagen. Registro fotográfico comedor en operación y fachada del cdi guardianes de la selva en la apertura, tomadas en julio de 2023 (Fuente propia).



Registro fotográfico cdi guardianes de la selva apertura, tomadas en julio de 2023 (Fuente propia).



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Deporte Y Recreación, Con Oportunidad Y Progreso para Todos

No	Producto	Meta - Producto	Fuente Responsable -	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
9	Proyecto para la construcción de espacios deportivos, recreativos y culturales en el área urbana y rural	Programas proyectos e iniciativas formulados, gestionados e implementados	SECRETARIA DE PLANEACIÓN /IMDES	0	6	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, la secretaria de obras públicas apoyó la formulación, supervisión y ejecución de proyectos del sector recreación y deporte tanto con recursos propios como recursos en gestión:

- Suscripción del convenio interadministrativo 1444 de 2020, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque 2 opción 1 en el municipio de San José del Guaviare” y mediante este proceso se suscribió el contrato de obra cuyo objeto comprendió: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO DOS OPCIÓN UNO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.
- Formulación y ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INFANTIL E INCLUSIVO COMO SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE LA VIDA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.
- Suscripción del convenio interadministrativo COID 1285 de 2021, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE. Y del cual se derivó el contrato de obra “CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURÉ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE”.
- Suscripción del convenio COID-1205-2021cuyo objeto comprende: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE LA GOBERNACION DEL GUIAVIARE Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL Guaviare, mediante el cual se ejecuta la construcción del parque del Barrio La Paz.
- Convenio FP- 354 de 2021 - Celebrar un Convenio Interadministrativo entre el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ- FONDO PAZ Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE, con el fin de aunar esfuerzos, recursos y



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

capacidades para apoyar el desarrollo y la implementación de los proyectos propuestos por el Municipio del San José del Guaviare, dentro de las funciones asignadas a la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento. Con este convenio se logró la construcción de polideportivos cubiertos en las veredas La Carpa y Puerto Cachicamo.

Retos

- Ampliar, conservar y mantener la infraestructura deportiva tanto de la zona urbana como la zona rural, así mismo garantizar procesos de formación deportiva.

Recomendaciones

- Realizar el mantenimiento periódico de la infraestructura construida para evitar el deterioro de la misma.
- Coordinar en conjunto con el Imdes el seguimiento a las garantías de los proyectos, realizar las reclamaciones y procedimientos a los que haya lugar, a fin de preservar la estabilidad de las obras.
- Poner en funcionamiento la infraestructura construida y relacionada en las actividades realizadas por la administración 2020-2023.

Evidencias:

- **Registro Fotográfico**



Imagen. Registro fotográfico parque sacúdete, barrio sueños de prosperidad y Bicentenario 2, tomada en julio de 2022 (Fuente propia).



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Imagen. Registro fotográfico Polideportivo Panure, tomada en diciembre de 2022 (Fuente propia).



Imagen. Registro fotográfico segunda etapa Parque de la Vida, Parque infantil e inclusivo, tomada en diciembre de 2022 (Fuente propia).



Registro fotográfico Inauguración polideportivo, vereda La Carpa, abril de 2022.



Registro fotográfico Inauguración polideportivo, vereda Puerto Cachicamo, junio de 2022.



Registro fotográfico Construcción parque barrio La Paz, noviembre de 2023.

4. DIMENSIÓN GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD– OTRAS DEPENDENCIAS

Un entorno urbano, con oportunidad y progreso para todos.

No	Producto	Meta - Producto	Fuente Responsable -	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
1	Construcción del parque principal de San José del Guaviare	proyecto formulado e implementados	Secretaria de planeación	0	1	100%

Actividades realizadas



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Para el cumplimiento de esta meta, la secretaria de obras públicas apoyó la formulación, supervisión y ejecución:

- contrato de obra pública No 347 de 2021 que tiene por objeto “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

Retos

- Construir, mantener y embellecer los espacios públicos y zonas comunes del municipio que soportan actividades sociales fomentando la recreación, educación, salud, cultura, ambiente sano, reactivación económica y sobre todo desarrollo en el territorio.

Recomendaciones

- Realizar el mantenimiento periódico de la infraestructura construida para evitar el deterioro de la misma.
- Coordinar en conjunto con planeación el seguimiento a las garantías de los proyectos, realizar las reclamaciones y procedimientos a los que haya lugar, a fin de preservar la estabilidad de las obras.
- Poner en funcionamiento la infraestructura construida y relacionada en las actividades realizadas por la administración 2020-2023. Para el caso del parque central, garantizar personal que realice el cuidado, mantenimiento, conservación de la jardinería, sistemas de riego, esculturas, sistema eléctrico y demás elementos del proyecto acordes con el manual de mantenimiento y operación.

Evidencias:

- **Registro Fotográfico**



Registro fotográfico Panorámica nocturna parque de la constitución, enero de 2023.





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico Panorámica día parque de la constitución, enero de 2023.



Registro fotográfico Parque de la Constitución, noviembre de 2022.

No	Producto	Meta Producto	- Fuente Responsable	- Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
4	Construir andenes	Metros lineales	Secretaria planeación	de 0	2000	100%



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, la secretaria de obras públicas apoyó la formulación, supervisión y ejecución: de los siguientes proyectos:

- contrato de obra pública No 347 de 2021 que tiene por objeto “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.
- Contrato 332-2021 - Contratar la pavimentación en concreto rígido de la avenida principal del corregimiento el Capricho, municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, mediante este proyecto se pavimentaron 800 metros lineales en el Capricho.
- Contrato 265-2021 - Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al mejoramiento de vías urbanas en concreto hidráulico para los municipios de San José del Guaviare, el Retorno y Calamar, departamento del Guaviare. Mediante este contrato se intervino 3.8 kilómetros de vías en el área urbana en los sectores: en la calle 18 entre transversal 20 C y Carrera 29, calle 17 entre carreras 24 y 28, carrera 25 entre calles 18 y 22, calle 5 entre carrera 28 y puente de Panuré.
- Contrato 316-2021 - Contratar el suministro de materiales y elementos para construcción de vías urbanas en pavimento articulado rígido en el municipio de San José Del Guaviare. Mediante este proyecto construyeron 2.2 kilómetros de vía en pavimento articulado en los barrios bicentenario 1, Prados de San Sebastián, Belén de la Paz y Bicentenario 2. Actualmente se ejecuta otro proyecto en el sector de Belén de La Paz, Comcaja y el barrio Modelo en el SENA.
- Suscripción del convenio interadministrativo 1444 de 2020, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque 2 opción 1 en el municipio de San José del Guaviare” y mediante este proceso se suscribió el contrato de obra cuyo objeto comprendió: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO DOS OPCIÓN UNO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.
- Formulación y ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INFANTIL E INCLUSIVO COMO SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE LA VIDA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.

Importante mencionar que en cada uno de estos proyectos se realizó la actividad denominada andenes, los cuales sirven de circulación entre los escenarios. Con respecto a las pavimentadas se incluyó la construcción de los andenes a fin de garantizar la accesibilidad para todas las personas.

Retos

- Construir, mantener y embellecer los espacios públicos y zonas comunes del municipio que soportan actividades sociales fomentando la inclusión, recreación, educación, salud, cultura, ambiente sano, reactivación económica y sobre todo desarrollo en el territorio.

Recomendaciones




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023


- Realizar el mantenimiento periódico de la infraestructura construida para evitar el deterioro de la misma.
- Coordinar en conjunto con planeación e Imdes el seguimiento a las garantías de los proyectos, realizar las reclamaciones y procedimientos a los que haya lugar, a fin de preservar la estabilidad de las obras.
- Poner en funcionamiento la infraestructura construida y relacionada en las actividades realizadas por la administración 2020-2023.

Evidencias:

- Registro Fotográfico

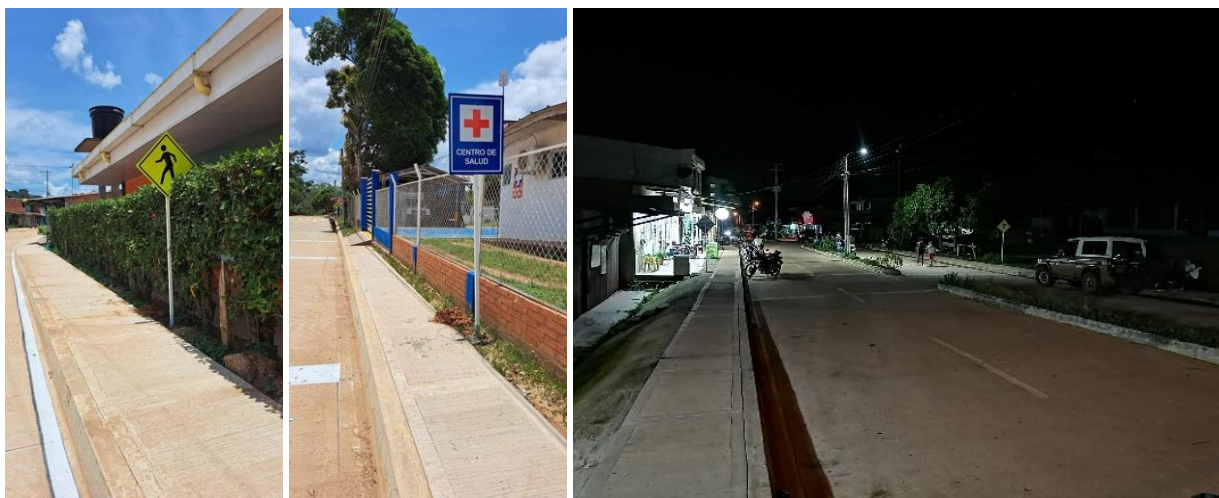

Registro fotográfico andenes pavimentada corregimiento Capricho, diciembre 2022

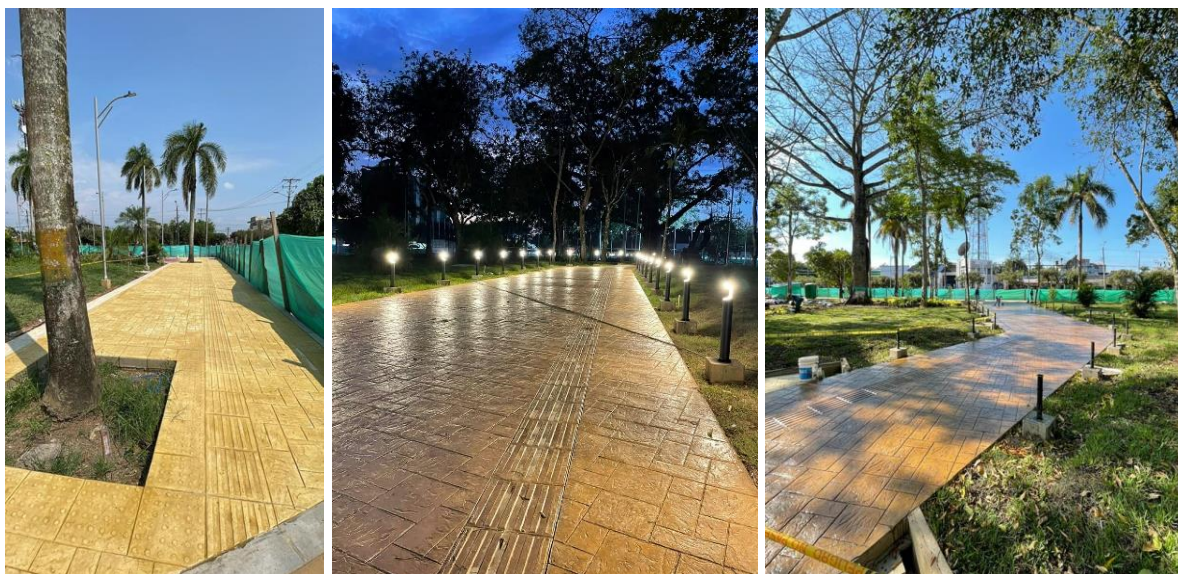

Registro fotográfico andenes parque de la constitución, agosto 2022.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico andenes en construcción y render parque de la vida, septiembre 2022.

No	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
6	Estudios y diseños para la construcción del Malecón Turístico	Documento elaborado	Secretaria de planeación	0	1	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, la administración adelanto el proyecto de consultoría para las obras de protección sobre la margen derecha del río Guaviare, a la altura del Centro y barrio 20 de julio, en el cual se incorporó en la parte superior del talud acabados arquitectónicos relacionados con la construcción de un malecón turístico. El proyecto fue presentado a la UNGRD y se aprobó técnicamente, pendiente de asignación de recursos para la etapa 2. A continuación se relaciona el proceso:

- CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA RIBERA DEL RIO GUAVIARE AGUAS ABAJO, DESDE LA ZONA CENTRO Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Retos

- Construir, mantener y embellecer los espacios públicos y zonas comunes del municipio que soportan actividades sociales fomentando la inclusión, recreación, educación, salud, cultura, ambiente sano, reactivación económica y sobre todo desarrollo en el territorio.

Recomendaciones

- Realizar seguimiento al estado de la asignación de recursos para la fase 2 del proyecto de enrocado en el barrio 20 de julio, o en su efecto gestionar los recursos ya que se cuenta con los productos, y este tiene concepto técnico favorable revalidado en noviembre de 2023.



Evidencias:

- Registro Fotográfico



Registro fotográfico topografía y batimetría proyecto enrocado 20 de julio, diciembre 2020.



Imagen diseños arquitectónicos, Render contrato de consultoría Enrocado 20 de julio, diciembre 20220.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

No	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
8	Construcción y/o adecuación de plazas de mercado	Proyecto formulado, gestionado e implementado	Secretaria de planeación	0	2	50%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, la administración municipal se presentó a la convocatoria 001 de 2020 realizada por el DPS y se suscribió el siguiente proceso:

- Convenio No FIP 518 de 2021 entre el “DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE”, cuyo objeto se refiere a “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, y financieros, entre el Departamento administrativo para la prosperidad social-fondo de inversión para la paz-PROSPERIDAD SOCIAL -FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social productiva, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la integración, estabilización y reconciliación social de conformidad con la ficha de estructuración” derivado del proceso anterior, se suscribe el contrato de obra No. 283 de 2022 cuyo objeto correspondió a: “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GUAVIARE- DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE” el cual como resultado de este proceso, se suscribió a los 18 días del mes de agosto del 2022 el contrato de obra 283-2022 con el CONSORCIO PLAZA SAN JOSÉ.

Retos

- Lograr la terminación y puesta en funcionamiento del proyecto denominado plaza del Barrio Porvenir, actualmente presenta un avance superior al 90% de ejecución, sin embargo, el contrato se encuentra suspendido hasta el 31 de enero de 2024 por solicitud del DPS, en atención al que el proyecto entro a reformulación por solicitud del contratista e interventoría a fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuento a acabados especiales y RCI. El municipio proyecto los recursos del presupuesto de la vigencia 2024 a fin de que se cuente con los recursos necesarios que den lugar a la financiación de las obras necesarias para la habilitación y funcionamiento del proyecto.

Recomendaciones

- Garantizar los recursos proyectados vigencia 2024, para apalancamiento del proyecto y que dan lugar a la finalización de la obra, habilitación y puesta en funcionamiento.
- Ajustar el contrato de obra de acuerdo a las modificaciones aprobadas por el DPS durante el proceso de reformulación del proyecto.
- Solicitar al DPS acompañamiento para la ejecución del componente social relacionado con la destinación y/o entrega de los locales a los beneficiarios.
- Determinar y ejecutar la figura legal mediante la cual se otorgarán los locales a la población beneficiada.
- Realizar seguimiento a la calidad y estabilidad de la obra, mediante los respectivos amparos legales.



Evidencias:

- Registro Fotográfico



Registro fotográfico render fachada principal, proyecto plaza porvenir, diciembre 2022.



Registro fotográfico ejecución de actividades, acabados proyecto plaza, noviembre 2023.

No	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
11	Proyecto para la adecuación y mejoramiento del cementerio municipal	Proyecto formulado, gestionado e implementado	Secretaria de planeación	0	1	100%



Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, la administración adelanto el proyecto de ampliación de la capacidad del cementerio municipal, construcción de andenes, acceso, shut de basuras y adecuación de la morgue, con el siguiente proceso:

- CONTRATO No 163 de 2020 - CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE CADÁVERES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.
- CONTRATO No 400 de 2020, Contratar el mantenimiento y adecuación de la morgue municipal de San José del Guaviare.

Retos

- Construir, ampliar, mantener y embellecer los espacios públicos y zonas comunes del municipio con ocasión a lo relacionado con la adecuación del cementerio municipal.

Recomendaciones

- Realizar el mantenimiento periódico de la infraestructura construida para evitar el deterioro de la misma.
- Coordinar en conjunto con planeación el seguimiento a las garantías de los proyectos, realizar las reclamaciones y procedimientos a los que haya lugar, a fin de preservar la estabilidad de las obras.
- Poner en funcionamiento la infraestructura construida y relacionada en las actividades realizadas por la administración 2020-2023. Con relación al cementerio coordinar con administrativa el funcionamiento tanto de las bóvedas como de la morgue a fin de garantizar las condiciones sanitarias del lugar y prevenir cierre o medidas cautelares por parte de la autoridad competente.

Evidencias:

- Registro Fotográfico



Registro fotográfico cementerio municipal, antes y después de la intervención, diciembre 2020.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

No	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
15	Gestión de un proyecto para la construcción de separadores de las calles principales de los centros poblados de los corregimientos	Kilómetros construidos	Secretaria de planeación	0	2	50%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, la administración adelanto el proyecto de pavimentación de la calle principal del corregimiento el Capricho, donde de incluyo la construcción del separador, a continuación, se relaciona el proyecto:

- Contrato 332-2021 - Contratar la pavimentación en concreto rígido de la avenida principal del corregimiento el Capricho, municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare.

Retos

- Mejorar la movilidad y seguridad en las vías mediante la construcción de proyectos de infraestructura vial en los centros poblados rurales.
- Construcción de separadores en el centro poblado Boquerón.

Recomendaciones

- Formular el plan de pavimentación de vías teniendo en cuenta factores como conectividad, manejo de aguas lluvias, corredores estratégicos y demás elementos que permitan garantizar condiciones de movilidad y seguridad para todos los actores viales.
- Exigir al Departamento la concertación de los proyectos de infraestructura vial con la secretaria de planeación municipal y la secretaria de obras públicas municipales.

Evidencias: Registro fotográfico.



Registro fotográfico Pavimentación avenida principal Corregimiento el Capricho, noviembre 2022.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE****INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023**

No	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
16	Construcción y/o adecuación de la Casa Indígena	Infraestructura construida y/o adecuada	Secretaria planeación	0	1	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, la administración adelanto los estudios y diseños, los presento a fondo paz y en la vigencia 2022 se aprobaron los recursos, sin embargo, la ejecución la adelanta Presidencia, a continuación, se relaciona el proyecto:

- Convenio FP- 354 de 2021 - Celebrar un Convenio Interadministrativo entre el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ- FONDO PAZ Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE, con el fin de aunar esfuerzos, recursos y capacidades para apoyar el desarrollo y la implementación de los proyectos propuestos por el Municipio del San José del Guaviare, dentro de las funciones asignadas a la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento. Con este convenio se logró la asignación de recursos para la construcción de la casa indígena en el área urbana, el proyecto actualmente se encuentra en ejecución con fecha de terminación 30 de diciembre de 2023.

Retos

- Disponer los recursos para la habilitación y puesta en funcionamiento del hogar de paso indígena. Los recursos fueron priorizados en el presupuesto 2024.
- Coordinar con las demás entidades como gobernación e ICBF la concurrencia para la puesta en funcionamiento de la casa hogar de paso indígena.
- Elaborar manual de funcionamiento de la casa indígena.

Recomendaciones

- Realizar el mantenimiento periódico de la infraestructura construida para evitar el deterioro de la misma.
- Coordinar en conjunto con planeación y administrativa el seguimiento a las garantías de los proyectos, realizar las reclamaciones y procedimientos a los que haya lugar, a fin de preservar la estabilidad de las obras.
- Poner en funcionamiento la infraestructura construida y relacionada en las actividades realizadas por la administración 2020-2023.
- Coordinar el funcionamiento de la misma en cabeza de la secretaria administrativa y planeación.
- Realizar la gestión de dotación y menaje requerido para dicha infraestructura.
- Garantizar los recursos para el funcionamiento.

Evidencias:

Registro fotográfico.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Registro fotográfico Render de la fachada principal proyecto hogar de paso indígena, noviembre 2021.



Registro fotográfico de la fachada principal ejecución de la obra hogar de paso indígena noviembre 2023.

No	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
18	Proyecto para la construcción de parques biosaludables y/o parques infantiles	Proyecto formulado, gestionado e implementado	Secretaria planeación	0	1	100%



Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, la secretaria de obras públicas apoyó la formulación, supervisión y ejecución de proyectos del sector recreación y deporte tanto con recursos propios como recursos en gestión, en el siguiente proyecto se realizó la construcción de una sección de juegos biosaludables:

- Suscripción del convenio interadministrativo 1444 de 2020, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque 2 opción 1 en el municipio de San José del Guaviare” y mediante este proceso se suscribió el contrato de obra cuyo objeto comprendió: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO DOS OPCIÓN UNO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.

Retos

- Ampliar, conservar y mantener la infraestructura deportiva tanto de la zona urbana como la zona rural, así mismo garantizar procesos de formación deportiva.

Recomendaciones

- Realizar el mantenimiento periódico de la infraestructura construida para evitar el deterioro de la misma.
- Coordinar en conjunto con el Imdes el seguimiento a las garantías de los proyectos, realizar las reclamaciones y procedimientos a los que haya lugar, a fin de preservar la estabilidad de las obras.
- Poner en funcionamiento la infraestructura construida y relacionada en las actividades realizadas por la administración 2020-2023.

Evidencias:

- **Registro Fotográfico**



Imagen. Registro fotográfico parque sacúdete, barrio sueños de prosperidad y Bicentenario 2, tomada en julio de 2022 (Fuente propia).



Imagen. Registro fotográfico juegos biosaludables parque sacúdete, barrio Sueños de Prosperidad y Bicentenario 2, tomada en enero de 2022 (Fuente propia).

5. DIMENSIÓN AMBIENTAL– OTRAS DEPENDENCIAS

Programa: Gestión del Riesgo de Desastres, con Oportunidad y Progreso para Todos.

No	Producto	Meta - Producto	Fuente - Responsable	Línea base	Meta Cuatrienio	% de Avance
9	Proyecto para la construcción de un muro de contención en la rivera del río Guaviare, que presente afectación por derrumbe.	Programas, proyectos e iniciativas formulados, gestionados e implementados	Secretaria planeación	0	1	100%

Actividades realizadas

Para el cumplimiento de esta meta, la secretaria de obras públicas apoyó la formulación, supervisión y ejecución de proyectos del sector riesgos tanto con recursos propios como recursos por gestión, así:

- Contrato 431-2020 CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA RIBERA DEL RIO GUAVIARE AGUAS ABAJO, DESDE LA ZONA CENTRO Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.
- Contrato 317-2020 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS DE EROSIÓN Y MIGRACIÓN LATERAL DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GUAVIARE EN EL SECTOR DE INFLUENCIA DEL BFIM NO. 32, EN LA VEREDA BARRANCÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.
- Contrato No 268 de 2021 CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIVERA RIO



GUAVIARE AGUAS ABAJO DESDE LA ZONA CENTRO Y 20 DE JULIO EN MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.

Retos

- Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de las obras denominadas CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIVERA RIO GUAVIARE AGUAS ABAJO DESDE LA ZONA CENTRO Y 20 DE JULIO EN MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ETAPA 2 y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN PARA LA EROSIÓN Y MIGRACIÓN LATERAL DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GUAVIARE EN EL SECTOR DE INFLUENCIA DEL BFIM NO. 32 SEGUNDA FASE, EN LA VEREDA BARRACON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. Dichos proyectos cuentan con aval técnico ratificado por la UNGRD, sin embargo, se encuentra a la espera de la asignación de recursos.

Recomendaciones

- Realizar en coordinación con la secretaria de planeación el mantenimiento periódico de la infraestructura construida para evitar el deterioro de la misma.
- Coordinar en conjunto con planeación el seguimiento a las garantías de los proyectos, realizar las reclamaciones y procedimientos a los que haya lugar, a fin de preservar la estabilidad de las obras.
- Establecer en conjunto con la inspección fluvial y la secretaria de planeación, el manejo para el amarre de las embarcaciones de gran calado.
- Realizar la gestión de recursos para la ejecución de la segunda etapa de los proyectos de barracón y Barrio 20 de julio.

Evidencias:

- Registro Fotográfico



Imagen. Registro fotográfico enrocado BFIM No. 32, tomada en enero de 2021 (Fuente propia).



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023



Imagen. Registro fotográfico enrocado BFIM No. 32, tomada en enero de 2021 (Fuente propia).



Imagen. Registro fotográfico enrocado sector Centro y 20 de julio, tomada en enero de 2022 (Fuente propia).



Imagen. Registro fotográfico enrocado sector Centro y 20 de julio, tomada en enero de 2022 (Fuente propia).



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

TULO II – ANALISIS DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA

CAPITULO 3. ANALISIS DE INDICADORES BIENESTAR

1. Programa: Vivienda, agua potable y saneamiento básico con oportunidad y progreso para todos.

Indicador: déficit de vivienda cuantitativo								Tipo de valor: Porcentaje	Meta 26.29%	Cuatrienio:
Línea Base	Año Base	Meta alcanzada x vigencia				Variación porcentual-base			Condición del indicador	Interpretación Variación porcentual 2022-Línea base
		Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
28.33%	2005	*29.9	*29.9	*29.9	*29.9	-1.57	-1.57	-1.57	medio	Aumento de población.
Fuente: Dane										

*Corresponde al último dato entregado por el DANE – vigencia 2018.

Análisis De Indicador:

El indicador de Déficit Cuantitativo identifica a los hogares que habitan en viviendas con deficiencias estructurales y de espacio, esto es, para los cuales es necesario adicionar nuevas viviendas al stock total de viviendas del país de tal forma que exista una relación uno a uno entre la cantidad de viviendas adecuadas y los hogares que requieren alojamiento.

De acuerdo con los datos que presenta la fuente, se prevé que este tuvo un aumento en atención a la cantidad de población en el territorio, lo anterior teniendo en cuenta la necesidad social al interior del país que hace que las familias se desplacen hacia los territorios más nuevos de la geografía del país en búsqueda de estabilidad y economía. También se cree que dicho indicador aumentó con ocasión a los problemas sociales del territorio relacionados con desplazamiento por cuenta de grupos al margen de la ley tanto a colonos como las comunidades étnicas.

A pesar de la problemática social, el indicador no tuvo un aumento significativo y durante la vigencia 2020-2023 en atención a las políticas de vivienda implementadas por el gobierno nacional, departamental y municipal mediante la ejecución de proyectos construcción y mejoramiento de vivienda tanto en el sector urbano como en el sector rural.

Por otra parte, otro factor importante que ha permitido mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares del territorio y en efecto la mejora en el indicador, corresponde a la implementación de los acuerdos de paz, teniendo en cuenta que el municipio de San José del Guaviare se encuentra ubicado en la subregión PDET Macarena – Guaviare, Por tanto cuenta con otra fuente de financiación de proyectos y gracias a la gestión de la administración en concurrencia con el Departamento se logró la ejecución de proyectos de construcción de vivienda.

Indicador: déficit de vivienda cualitativo								Tipo de valor: Porcentaje	Meta 57.95%	Cuatrienio:
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	----------------	-------------



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Línea Base	Año Base	Meta alcanzada x vigencia				Variación porcentual- base			Condición del indicador	Interpretación Variación porcentual 2022-Línea base
		Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
58.46 %	2005	36.77*	36.77*	36.77*	36.77*	21.69	21.69	29.69	medio	Ejecución de proyectos de mejoramiento de vivienda.
Fuente: Dane										

*Corresponde al último dato entregado por el DANE – vigencia 2018.

Análisis De Indicador:

El Déficit Cualitativo identifica a los hogares que habitan en viviendas que requieren mejoramientos o ajustes para cumplir con condiciones de habitabilidad adecuadas. Este concepto reconoce que las deficiencias que tienen las viviendas en las que habitan estos hogares son susceptibles de ser corregidas mediante mejoramientos de vivienda. Durante la vigencia 2020-2023 se prevé que este indicador tuvo una mejora significativa entre los últimos datos entregados por el DANE en atención a las políticas de vivienda implementadas por el gobierno nacional, departamental y municipal mediante la ejecución de proyectos construcción y mejoramiento de vivienda tanto en el sector urbano como en el sector rural.

Por otra parte, otro factor importante que ha permitido mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares del territorio y en efecto la mejora en el indicador, corresponde a la implementación de los acuerdos de paz, teniendo en cuenta que el municipio de San José del Guaviare se encuentra ubicado en la subregión PDET Macarena – Guaviare, Por tanto cuenta con otra fuente de financiación de proyectos y gracias a la gestión de la administración en concurrencia con el Departamento se logró la ejecución de proyectos como suministro de energía convencional mediante ampliación de redes y alternativa mediante paneles fotovoltaicos llevando de esta manera mejoras en las viviendas, así mismo se ha logrado la construcción de unidades sanitarias.

Por lo anterior es pertinente mencionar que el comportamiento dl indicador es positivo.

Indicador: índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (irca)						Tipo de valor: Porcentaje			Meta Cuatrienio: 0.900%	
Línea Base	Año Base	Meta alcanzada x vigencia				Variación porcentual- base			Condición del indicador	Interpretación Variación porcentual 2022-Línea base
		Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
0.954 %	2018	1.7%	2,3%	1%	1%	0.746 %	1.346 %	0.046 %	SIN RIESGO	La calidad se afectó, sin embargo, se encuentra dentro de los parámetros normativos de calidad.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Fuente: Minvivienda, informes
Monitoreo a los recursos del
SGP-APSB

Análisis De Indicador:

De acuerdo con los reportes presentados y la información recibida, relacionada con el IRCA en los monitoreos realizados por el ministerio de vivienda a los recursos SGP-APSB se evidencia que la calidad del agua bajo, no obstante, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2115 – 2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”, el resultado indica que el agua es apta para consumo humano. Ahora bien, con respecto al comportamiento del indicador es necesario precisar que la prestación del servicio es realizada por la Empresa Empoaguas, y con respecto a las variaciones indican que se debe a motivos relacionados con la planta de tratamiento

Para lograr el cumplimiento de la meta o en su efecto mantener la calificación del indicador se debe realizar una revisión de los procedimientos tanto del funcionamiento como de la toma de muestras, así mismo implementar las medidas necesarias que eviten poner en riesgo la salud de los usuarios.

Indicador: personas con acceso a agua potable						Tipo de valor: Porcentaje			Meta Cuatrienio: 88%	
Línea Base	Año Base	Meta alcanzada x vigencia				Variación porcentual- base			Condición del indicador	Interpretación Variación porcentual 2022-Línea base
		Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
67%	2018	35%	48%	48%	48%	32%	19%	19%	Bajo	Ver análisis.
Fuente: Minvivienda, informes Monitoreo a los recursos del SGP-APSB										

Análisis De Indicador:

Partiendo de que los datos corresponden a lo publicado por el ministerio de Vivienda en el aparte denominado Informes de Monitoreo SGP, que corresponden a lo reportado por las empresas prestadoras de los servicios públicos y los datos que reporta la entidad territorial es importante mencionar que: El reporte de la información de cobertura del servicio de acueducto municipal, reporta una reducción en el porcentaje de cobertura del 48% para el periodo (2018-2019) y 007% para el periodo (2019-2020) y un aumento de la cobertura del 8,35% con respecto al último año reportado (2021), al evaluar los registros presentados se evidencia una inconsistencia puesto que no se ha presentado algún evento que justifique tales valores, es posible que la información reportada corresponda a datos del SUI, la cual, presentó problemas técnicos en el cargue de la información reportando coberturas inferiores a las existentes, de acuerdo al análisis de la información primaria suministrada por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EMPOAGUAS E.S.P. Al comparar la información con datos existentes en EMPOAGUAS E.S.P se determina que la cobertura del servicio de acueducto municipal se encuentra sobre 60% de cobertura para el periodo 2019 a 2021, permaneciendo



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

casi constante para el periodo mencionado, los valores de coberturas se encuentran para el periodo 2018 al 2021 sobre el 50% de cobertura.

Por otra parte, es necesario mencionar que se cuenta con disponibilidad de servicio de acueducto en el total de la zona urbana, sin embargo, los habitantes optan por hacer uso de los pozos perforados para el suministro de agua.

Indicador: Continuidad del servicio urbano de agua (hr/día)						Tipo de valor: Numero			Meta Cuatrienio: 23.5	
Línea Base	Año Base	Meta alcanzada x vigencia				Variación porcentual- base			Condición del indicador	Interpretación Variación porcentual 2022-Línea base
		Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
23.1	2018	22.7	23.5	23.9	23.9	-0.4	0.4	0.8	SUFICIE NTE	Se mejoró la fuente de abastecimiento.
Fuente: Minvivienda, informes Monitoreo a los recursos del SGP-APSB										

Análisis De Indicador:

Para este indicador y de acuerdo con los reportes presentados por el ministerio de vivienda en el Monitoreo a los recursos del SGP-APSB, se cumplió la meta programada. Lo anterior obedece a que la empresa prestadora del servicio de acueducto Empoaguas en conjunto con la administración municipal, adoptaron las medidas necesarias y pertinentes para garantizar continuidad en la prestación del servicio. De lo anterior se tiene que, se construyeron pozos perforados en la empresa, los cuales suplen el embalse cuando se presentan contingencias o en su efecto en la época de verano, donde era muy común los racionamientos. En la actualidad el servicio de acueducto se presta de manera constante, hubo avance en la continuidad y la clasificación del indicador es favorable en razón a la construcción de fuertes de abastecimiento alternas que garantizan el cumplimiento de los principios de la prestación del servicio de acueducto (cobertura, calidad y continuidad).

Indicador: personas con acceso a una solución de alcantarillado						Tipo de valor: Porcentaje			Meta Cuatrienio: 80	
Línea Base	Año Base	Meta alcanzada x vigencia				Variación porcentual- base			Condición del indicador	Interpretación Variación porcentual 2022-Línea base
		Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
65%	2018	88%	47%	47%	47%	n/a	n/a	n/a	SUFICIE NTE	Ver análisis
Fuente: Minvivienda, informes Monitoreo a los recursos del SGP-APSB										



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Análisis De Indicador:

Se evidencia inconsistencia en la información del reporte realizada por la empresa prestadora de servicio, lo anterior teniendo en cuenta que no han ocurrido eventos que hubiesen generado el desbalance con ocasión a la información histórica que se trae, es necesario realizar mesa de trabajo con el ministerio a fin de verificar la información reportada contra la que se entrega en los informes de seguimiento, en la actualidad se tiene disponibilidad de alcantarillado en casi la totalidad de la zona urbana, sin embargo la comunidad ha optado por hacer uso de los pozos sépticos.

2. Programa: Vías e infraestructura con oportunidad y progreso para todos.

Indicador: Red vial terciaria en buen estado									Tipo de valor: Porcentaje	Meta Cuatrienio: 100
Línea Base	Año Base	Meta alcanzada x vigencia				Variación porcentual- base			Condición del indicador	Interpretación Variación porcentual 2022-Línea base
		Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
100	2019	90	90	90	90	10	10	10	OPTIMO	Se mantuvieron transitables los corredores del plan vial.
Fuente: Secretaria de obras publicas										

Análisis De Indicador:

Con la aprobación del plan vial municipal en diciembre de 2020 se logró establecer las prioridades de intervención vial de acuerdo a la capacidad del municipio y la asistencia que brindó el departamento. Es necesario aclarar que el 100% del indicador obedece a mantener en condiciones de transitabilidad los corredores que se encuentran inmersos en el plan vial con concepto ambiental favorable. Por tanto, el municipio para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo realizó durante cada vigencia el cronograma de trabajo denominado plan verano y después en los demás meses se preparaba para intervenciones de emergencias. Para los resultados de lo anterior se realizó la contratación de combustibles, repuestos, prestación de servicio de operadores, alquiler de maquinaria, coordinación plan verano o plan de trabajo con Gobernación, gestión ante el gobierno nacional para mejoramientos viales. Si bien se completó la meta establecida en el plan de desarrollo, esto en el indicador no se llevó al 100% en atención a que, por las condiciones climáticas, el tráfico diario, el tipo de material de la rasante de las vías, las intervenciones que se realizaban, no se lograba mantener la totalidad del corredor en buen estado durante los 12 meses del año. De otro lado es importante relacionar que es un reto inmenso lograr el cumplimiento de la meta puesto que la capacidad operativa de la dependencia es superada por la necesidad, algunas máquinas del parque automotor ya cumplieron ciclo y se depende de la asistencia que pueda brindar el departamento.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE****INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023**

Indicador: Vías urbanas en buen estado.							Tipo de valor: Porcentaje		Meta Cuatrienio: 60	
Línea Base	Año Base	Meta alcanzada x vigencia				Variación porcentual- base			Condición del indicador	Interpretación Variación porcentual 2022-Línea base
		Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
58.6	2019	58.6	58.6	58.6	58.6	0	0	0	OPTIMO	Se mantuvieron transitables las vías urbanas.
Fuente: Secretaria de obras publicas										

Análisis De Indicador:

Para cada vigencia, la entidad territorial logró mantener transitables los 58.6 kilómetros de red vial urbana sin pavimento, Importante destacar que debido a los altos volúmenes de tránsito diario, las constantes lluvias, la inexistencia de una fuente de material que garantice condiciones de durabilidad y consistencia y la poca maquinaria con la que cuenta la entidad, se debía realizar constantemente el mantenimiento a los puntos más críticos de la malla vial urbana. De otro lado es importante relacionar que es un reto inmenso lograr el cumplimiento de la meta puesto que la capacidad operativa de la dependencia es superada por la necesidad, algunas máquinas del parque automotor ya cumplieron ciclo y se depende de la asistencia que pueda brindar el departamento.

Indicador: Cobertura en servicio de alumbrado publico								Tipo de valor: Porcentaje	Meta Cuatrienio: 60	
Línea Base	Año Base	Meta alcanzada x vigencia				Variación porcentual- base			Condición del indicador	Interpretación Variación porcentual 2022-Línea base
		Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
ND	ND	80	80	90	90	10	10	0	OPTIMO	Se avanzó en el último bienio con proyectos de modernización del alumbrado.
Fuente: Secretaria de obras publicas										

Análisis De Indicador:

Se recibió la administración con una cobertura cercana al 80%, para cumplimiento de las metas y establecer un avance en el indicador según lo propuesto el municipio ejecuta en la actualidad los proyectos de modernización del alumbrado público (3-4 y 5 etapa), donde se amplían redes en algunos sectores tanto del sistema moderno como las convencionales que se desmontan y ubican en nuevos sectores. El indicador también tuvo un incremento positivo ya que se logró recuperar algunos parques, zonas verdes y escenarios



deportivos que carecían del servicio. Si bien se logró el cumplimiento, es necesario destinar los recursos suficientes para garantizar la AOM, y que la entidad pueda contar con el personal, equipo y herramientas necesarias a fin de que sea sostenible en el tiempo en cuanto a funcionamiento se refiere. Este indicador también se complementa con la cobertura que se logró llevar a sector rural en varios centros poblados, La Carpa, Capricho, Mirolindo, Puerto Arturo, Raudal, Boquerón, Altos de San Jorge, Villa Alejandra, entre otros. Es necesario realizar la cobertura toda vez que con la entrada en vigencia del PBOT se ampliaron algunos usos de suelo y no se cuenta con el servicio.

CAPITULO 4. INFORME DETALLADO DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES

No aplica.

CAPITULO 5. ACCIONES ADICIONALES RELIZADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Existen otras acciones misionales, asociadas a procesos, procedimientos que no hacen parte de las metas del plan de desarrollo u otras acciones asociadas a compromisos, planes de acción, programas regionales o iniciativas apoyadas por su dependencia que se desarrollaron durante el cuatrienio.

1. Nombre de la Acción: Medidas de contención y control de la propagación del Covid-19.

Descripción: Se realizó la desinfección de áreas comunes y concurridas, así como la construcción de puntos de lavado de manos en el marco de la prevención de la propagación del Covid-19 en la zona urbana del municipio de San José del Guaviare.

Resultados: Ultimo municipio y/o departamento donde ingreso el Covid y baja tasa de mortalidad según lo esperado. La población beneficiada correspondió a la totalidad de los habitantes del municipio de San José del Guaviare.





2. Nombre de la Acción: Apoyo económico para el pago de la tarifa de acueducto y alcantarillado en el marco de la Pandemia Covid-19.

Descripción: La Administración Municipal realizó a EMPOAGUAS E.S.P., el proceso del pago del 100% de la factura del mes de mayo de 2020 de los servicios de Acueducto y Alcantarillado de los estratos 1, 2 y 3, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos para el efecto y la necesidad de priorizar las asignaciones para las personas de menores ingresos, del municipio de San José del Guaviare, en el marco de la pandemia Covid 19.

Resultados: Acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en tiempo de pandemia, se benefició a toda la población estratos 1-2-3 de la zona urbana del municipio de San José del Guaviare.

3. Nombre de la Acción: Apoyo para el suministro de agua en bloque a comunidades indígenas y población del área rural en temporada de verano.

Descripción: La Administración Municipal en conjunto con Empoaguas, y el apoyo del ejército nacional realizó el suministro de agua en bloque para la comunidad indígena Nukak del asentamiento Agua Bonita, la vereda altos de San Jorge en temporada de verano.

Resultados: Acceso agua potable en temporada seca, se benefició al asentamiento Nukak de agua bonita y la vereda Altos de San Jorge del municipio de San José del Guaviare. Actualmente se realizó la gestión con la unidad de víctimas para el suministro de tanques plásticos que permitan llevar agua potable en volquetas de la secretaría de obras públicas, a fin de garantizar el acceso al agua del asentamiento Agua Bonita. Los tanques se encuentran en obras públicas y los depósitos en el asentamiento.



4. Nombre de la Acción: Terminación y puesta en marcha del proyecto: Construcción y remodelación de los comedores populares en el municipio de San José del Guaviare departamento del Guaviare – contrato 428-2017.

Descripción: En la secretaria de obras públicas realizó acompañamiento al proceso de finalización, entrega y puesta en marcha del proyecto de remodelación de los comedores populares, de tal manera que se dio apertura al mismo en pleno proceso de reactivación económica durante la pandemia del Covid 19.

Resultados: Infraestructura terminada y puesta en funcionamiento beneficiando de manera directa a la asociación ASOVENCO y a toda la población del municipio de San José del Guaviare en general.



5. **Nombre de la Acción:** Terminación y puesta en marcha el proyecto construcción de cubierta y mejoramiento del polideportivo del barrio la granja del municipio de San José del Guaviare – Guaviare – contrato 429 de 2017.

Descripción: En la secretaria de obras públicas realizó acompañamiento al proceso de finalización, entrega y puesta en marcha del proyecto de remodelación del polideportivo La Granja, posteriormente la entidad inicia los procesos de formación deportiva en el escenario.

Resultados: Infraestructura terminada y puesta en funcionamiento beneficiando de manera directa a toda la población del municipio de San José del Guaviare en general.



6. **Nombre de la Acción:** Terminación y puesta en marcha el proyecto: sistematización construcción de parque infantil con energía solar en San José del Guaviare, Guaviare, Orinoquía – contrato 588-2016.

Descripción: En la secretaria de obras públicas realizó acompañamiento al proceso de finalización, entrega y puesta en marcha del proyecto de construcción del parque infantil con energía solar, garantizando espacios de sano desarrollo a las niñas y niños del municipio.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Resultados: Infraestructura terminada y puesta en funcionamiento beneficiando de manera directa a toda la población del grupo poblacional infancia y primera infancia del municipio de San José del Guaviare en general.



7. Nombre de la Acción: Terminación y puesta en funcionamiento de los puestos de salud en los centros poblados de los corregimientos Capricho y Boquerón.

Descripción: En la secretaria de obras públicas realizó acompañamiento al proceso de finalización, entrega y puesta en marcha del proyecto de obras complementarias que permitieron finalizar la construcción de los puestos de salud de Boquerón y Capricho, logrando de esta manera su habilitación.

Resultados: Infraestructura terminada y puesta en funcionamiento beneficiando de manera directa a la población de los corregimientos Capricho y Boquerón.



8. Nombre de la Acción: Reactivación, puesta en funcionamiento y cierre de la mesa social de acompañamiento al programa de vivienda gratuita en el municipio.

Descripción: La secretaria de obras públicas realizó acompañamiento y ejerció secretaria técnica a la operatividad de la mesa, acompañamiento, y cierre de compromisos en el barrio sueños de prosperidad en el marco de programas de vivienda gratuita en el municipio. Ver Decreto 1085 de 2021.

Resultados: Cumplimiento de compromisos en el sector y la operatividad de la mesa de seguimiento.

9. Nombre de la Acción: convocatorias programas de vivienda rural y urbana.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

Descripción: En el marco de los programas de vivienda del municipio, la secretaria de obras públicas realizó acompañamiento, asistencia y apoyo logístico en las convocatorias de programas de vivienda urbana y rural, en coordinación con Comcaja, Gobernación y ministerio de vivienda. Para el periodo se ejecutaron 2 convocatorias, una para el proyecto denominado bosques de San Ignacio y un programa de Vivienda para el campo.

Resultados: Selección de beneficiarios y materialización de 231 subsidios de vivienda.

TITULO III. INFORMACIÓN ESTRATEGICA

CAPITULO 6. RELACIÓN DE BIENES E INMUEBLES

1. Listado de Bienes (ALMACEN)

Fecha	Artículo	Activo	Placa	Nombre	Grupo	Cantidad	Valor	Ubicación
19/10/2023	N/A	N/A	OSP30	MOTOCICLETA SUZUKI VIVA 115, MOTOR E-409-TH419295, CHASIS BE-42C-SC006777, MODELO 2002 PLACA OSP-30, COLOR ROJO	TERRESTRE	1	4.250.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	JTE443	CAMPERO DAIHATSU MODELO 80 PLACA JTE-443, COLOR ROJO Y BLANCO CABINADO, MOTOR 12R-2101620, CHASIS F20-100158	TERRESTRE	1	8.000.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	OZI129	CAMIONETA HILUX 4X4 DOBLE CABINA, FULL EQUIPO, MODELO 2006, MARCA TOYOTA, SERIE 9FH33UNG868010174, COLOR CARROCERÍA ROJO DINAMO, CAJA DE CAMBIOS MECÁNICA, TIPO DE MOTOR 2.438 C.C., POTENCIA 140 HP, N° DE MOTOR 3420097, N° DE CHASIS 9FH33UNG868010174, LLAN	TERRESTRE	1	82.000.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	700H909790	BULDOZER JOHN DEERE MODELO 700 H, AÑO 2002, SERIE 700H909790, MOTOR PE6068T225254	TERRESTRE	1	347.787.500,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	2446886	GUADAÑA MARCA HONDA 4 TIEMPO SERIAL 2446886, 2447068, 2447049 Y 2447034	HERRAMIENTAS ACC	4	1.624.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	GUADAÑADORA CON CILINDRAJE ENTRE (41-45), CARBURADOR DE DIAFRAGMA, DE EJE FLEXIBLE, RELACIÓN MEZCLA GASOLINA/ACEITE 50:1, CON SISTEMA DE NCENDIDO TDI	HERRAMIENTAS ACC	1	1.219.800,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	Sierra podadora de altura: cilindrada 23.6 cm3, peso 7.3kg, longitud total extendida 3.91 m, espada de acero con dientes recubiertos en cromo duro. Marca Hecho	HERRAMIENTAS ACC	1	2.175.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	SIN	VOLQUETA KODIAK 157, MODELO 2003, COLOR BLANCO, ARCO BICAPA, MARCA CHEVROLET,	TERRESTRE	1	128.000.000,00	OBRAS PUBLICAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

				CHASIS CABINA, CAPACIDAD 11 TONELADAS, SERVICIO OFICIAL, CILINDRAJE 6.600, TIPO DE CARROCERÍAS CHASIS: MOTOR NO.9SZ13225 Y NO.9GDP7H1C33B320108				
19/10/2023	N/A	N/A	SIN	VOLQUETA KODIAK 157, MODELO 2003, COLOR BLANCO, ARCO BICAPA, MARCA CHEVROLET, CHASIS CABINA, CAPACIDAD 11 TONELADAS, SERVICIO OFICIAL, CILINDRAJE 6.600, TIPO DE CARROCERÍAS CHASIS: MOTOR NO.9SZ13578 Y NO.9GDP7H1C33B320109 NO. INTERNO 16	TERRESTRE	1	128.000.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	SIN	VOLQUETA KODIAK 157, MODELO 2003, COLOR BLANCO, ARCO BICAPA, MARCA CHEVROLET, CHASIS CABINA, CAPACIDAD 11 TONELADAS, SERVICIO OFICIAL, CILINDRAJE 6.600, TIPO DE CARROCERÍAS CHASIS: MOTOR NO.9SZ13026 Y NO.9GDP7H1C23B221812	TERRESTRE	1	128.000.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	OKZ 474	VOLQUETA CAMION UN TROQUE MARCA CHEVROLET CHASIS CAB FVR 700P 8L MT SWB E4 MODELO 2017 COLOR BLANCO CAPACIDAD 11546 KG CILINDRAJE 7790 CHASIS 9GDFVR342GB028327 PLACA OKZ-474	TERRESTRE	1	290.657.690,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	OKZ 475	VOLQUETA CAMION UN TROQUE MARCA CHEVROLET CHASIS CAB FVR 700P 8L MT SWB E4 MODELO 2017 COLOR BLANCO CAPACIDAD 11546 KG CILINDRAJE 7790 CHASIS 9GDFVR340 GB028326 PLACA OKZ-475	TERRESTRE	1	290.657.690,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	OKZ476	VOLQUETA CAMION UN TROQUE MARCA CHEVROLET CHASIS CAB FVR 700P 8L MT SWB E4 MODELO 2017 COLOR BLANCO CAPACIDAD 11546 KG CILINDRAJE 7790 CHASIS 9GDFVR349 GB028325 PLACA OKZ-476	TERRESTRE	1	290.657.690,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	RETROCARGADORA JOHN DEERE MODELO 310 SG DOBLE TRANSMISIÓN, SERIE T0310SG907759, MOTOR T04045 T909093, AÑO 2002	TERRESTRE	1	189.749.900,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	THK091	TOYOTA LANDCRUISER BLANCA DONACION SAE	TERRESTRE	1		OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	CARGADORA RETROEXCAVADORA 580H	TERRESTRE	1	19.544.642,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	RETROEXCAVADORA CARGADORA CON CUCHARA FRONTAL TEREX MODELO TLB 830PCSS, SERIAL S/N	TERRESTRE	1	374.173.033,00	OBRAS PUBLICAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

				SMFJB4ACOGTHS3986, MOTOR MODEDLO 1104D- 44T TE MARCA PERKINS 1100 SERIES ENGIBE S/N NL3892U271991B AÑO 2016 COLOR BLANCO PLACA N° MCO39909				
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	RODILLO VIBRO COMPACTADOR, MODELO W1103D, SERIE JKC8321404, MOTOR 6BT21532985	TERRESTRE	1	229.000.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	VIBROCOMPACTADOR MEDIANO ASC70 MARCA AMMAN MOTOR MARCA CUMMINS MODELO QSB3.3 (B33) MODELO 2016COLOR AMARILLO MOTOR N° 68333468 PLACA MCO37348	TERRESTRE	1	412.719.040,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	MEZCLADORA TIPO TROMPO MOTOR DIESEL 10HP -3600RPM LAMINA CAL 3/16" GIRO DE 360°, LLANTA RIN RIN 13 CAPACIDAD MAXIMA 360 LITROS CAPACIDAD DE TRABAJO 325 LITROS PARA 1/2 BULTO UND	TERRESTRE	1	8.000.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	COMPACTADOR TIPO RANA MOTOR DIESEL DE10HP LAMINA CALIBRE 1/4 BASE DE 70X55 CM,FUERZA DE IMPACTO 1700 KG, VELOCIDAD 38METROX MINUTO UND	TERRESTRE	2	7.000.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	MOTONIVELADORA JOHN DEERE MODELO 670 CH, SERIE DW70CH585236, MOTOR T06068H1215210	TERRESTRE	1	425.256.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	MOTONIVELADORA ART. EN LLANTAS CATERPILLAR 2000	TERRESTRE	1	129.686.400,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	MOTONIVELADORA SOBRE RUEDAS CASE MODELO 845B REFERENCIA 542200130, CHASIS N° HBZNO845CGAF05559 AÑO 2016 COLOR AMARILLO MOTOR MODELO F4HE9687W*J101FPT 6.7L MARCA FPT INDUSTRIAL SPA/CASE ENGINE S/N 001338886	TERRESTRE	1	923.919.290,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	ZORRA DE TIRO PARA TRACTOR	TERRESTRE	1	300.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	MAQUINA ROTOSONDA, MOTOR MARCA HONDA DE 9 HP	TERRESTRE	1	16.066.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA, MOTOR DIESEL MARCA HONDA DE 4.2 HP A 3600 RPM. REF. HND 130-768566	TERRESTRE	1	4.118.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO EXTENCION DE 12METROS DE LONGITUD Y 36 KG. DE PESO	HERRAMIENTAS ACC	1	2.750.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 24 PELDAÑOS	HERRAMIENTAS ACC	1	1.680.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	Escala en fibra de vidrio de dos cuerpos de 40 pasos en total	HERRAMIENTAS ACC	1	1.887.340,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	Computador de escritorio de línea corporativa, Torre de formato reducido, Procesador Intel Core i5 2.4 Ghz, 6 Gb de Memoria RAM DDR3, Disco	EQUIPO COMPUTACION	1	3.425.000,00	OBRAS PUBLICAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

				Duro SATA de 500 Gb, Pantalla LED O LCD de 21 pulgadas HD de la misma marca. Puertos VGA, LAN Gigabit, USB 3.0. y US				
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	Computador de Escritorio para diseño y video. Procesador Intel Xeon E5-1603 (2.8 GHz, 10 MB de caché, 4 núcleos), memoria RAM DDR3 de 8 GB, disco duro SATA de 1 TB, pantalla LED O LCD de la misma marca de 23". Puertos LAN Gigabit, USB 3.0 y USB 2.0. Tarje	EQUIPO COMPUTACION	1	5.325.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	GPS: dimensiones de la unidad (Ancho, Alto/profundidad): 2,1" x 4" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm), tamaño de la pantalla (Ancho/alto): 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" en diagonal (5,6 cm). Resolución de pantalla (Ancho/Alto): 176 x 220 pixeles. Tipo de pan	EQUIPO COMUNICACIÓN	1	1.750.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	COMPUTADOR HP MONITOR HP COMPAC LE2002X TORRE HP COMPAQ PRO 4300 PROCESADOR CORE I15 VIVIENDA	EQUIPO COMPTACION	2	1.655.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	COMPUTADOR SAMSUNG SYNNCMASTER S22B150 PROCESADOR CORE 17 DIRETOR TECNICO	EQUIPO COMPUTACION	1	2.900.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	SILLA TIPO ERGONOMICA CON BRAZOS DE ALTURA GRADUABLE, SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE ASIENTO, ESPALDAR EN MALLA COLOR NEGRO, MARCO COLOR NEGRO, SISTEMA GIRATORIO, CINCO RUEDAS	MUEBLES Y ENCERES	8	406.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	MUEBLE EN MADERA PARA ORGANIZAR EN L 1.15X2M	MUEBLES Y ENCERES	1	1.200.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	MUEBLE EN MADERA PARA ORGANIZAR DE 2X0.90X2M	MUEBLES Y ENCERES	1	1.300.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	MUEBLE EN MADERA PARA ORGANIZAT DE 2X1.15	MUEBLES Y ENCERES	1	1.200.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	MUEBLE EN MADERA PARA ORGANIZAR DE 1.30X0.90M	MUEBLES Y ENCERES	1	800.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG DE 12000BTU	EQUIPO MAQUINA OFICINA	1	2.000.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ELECTROLUX DE 12000BTU	EQUIPO MAQUINA OFICINA	1	2.400.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	DISPENSADOR DE AGUA MARCA KALEY	OTROS MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA	1	3.272.500,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	TABLERO ACRILICO DE 245CM X 120CM	OTROS MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA	1	418.880,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	UPS STARTEC ST-0-650	EQUIPO MAQUINA OFICINA	1	400.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	SILLA ESPERE 3 PUESTOS	MUEBLES Y ENCERES	1	720.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	ARCHIVADOR RODANTE EN PINTURA	1	1	4.230.000,00	OBRAS PUBLICAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

				ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS DE 2 MTS DE ANCHO X 90 CM DE FONDO X 2 MTS DE ALTO (UN MÓDULO MECÁNICO DE UN CUERPO DE DOS SERVICIOS Y UN MÓDULO FIJO DE UN CUERPO Y DOS SERVICIOS, LATERAL ARCHIVO RODANTE Y CUERPO ARCHIVO DORANTE I				
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	ESCRITORIO EN MADERA CALIDAD CEDRO TIPO GERENTE LINEA ORVE DE 2 MTS X 0.60X 1MT, EXTENSIÓN DE 1.10X0.50 CON TECLADO PARA COMPUTADOR.	1	1	1.839.500,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	ESCRITORIOS EN MADERA CALIDAD CEDRO EJECUTIVO MEDIDAS DE 1.60X0.65 EXTENSIÓN DE 1.10 X0.50	1	2	1.600.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	SILLAS DE ESPERA EN MADERA, TAPIZADAS EN PAÑO SIN BRAZOS.	1	1	282.200,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	SILLAS DE ESPERA EN MADERA, TAPIZADAS EN PAÑO SIN BRAZOS.	1	1	282.200,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	SILLAS DE ESPERA EN MADERA, TAPIZADAS EN PAÑO SIN BRAZOS.	1	1	282.200,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	SILLAS DE ESPERA EN MADERA, TAPIZADAS EN PAÑO SIN BRAZOS.	1	1	282.200,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	SILLAS DE ESPERA EN MADERA, TAPIZADAS EN PAÑO SIN BRAZOS.	1	1	282.200,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	SILLAS DE ESPERA EN MADERA, TAPIZADAS EN PAÑO SIN BRAZOS.	1	1	282.200,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	SILLAS DE ESPERA EN MADERA, TAPIZADAS EN PAÑO SIN BRAZOS.	1	1	282.200,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	SILLAS DE ESPERA EN MADERA, TAPIZADAS EN PAÑO SIN BRAZOS.	1	1	282.200,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	SILLAS DE ESPERA EN MADERA, TAPIZADAS EN PAÑO SIN BRAZOS.	1	1	282.200,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	RECEPCIÓN EN MADERA CALIDAD CEDRO CON ESCRITORIO INCORPORADO, MEDIDAS DE 1.20X1.20X0.60, MEDIDA DE LA RECEPCIÓN 5MTS, CONPUERTA ADICIONAL.	1	1	2.265.000,00	OBRAS PUBLICAS
19/10/2023	N/A	N/A	N/A	SILLA TIPO GERENTE	1	1	1.285.000,00	OBRAS PUBLICAS

2. Listado de Inmuebles a cargo de su dependencia.

Nº	Dirección del bien inmueble	Código Catastral	Actividades, usos o Servicios	Existe un contrato de arrendamiento, comodato, acuerdo de voluntades, alianza publica privada u otro. (Mencione documento y describa su situación actual)
----	-----------------------------	------------------	-------------------------------	---



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

1	Cra 24 No. 9 -115	010000430003000	Funcionamiento secretaria de obras publicas	N/A
---	-------------------	-----------------	---	-----

CAPITULO 7. INSTANCIAS DE GOBERNANZA Y DIRECCIÓN

Comités en los cuales la Secretaría de Obras Publicas ejerce la Secretaría Técnica

- 1. Nombre: Mesa territorial de acompañamiento social para familias beneficiarias de proyectos de vivienda a gratuita en el municipio de San José del Guaviare.**

Acto Administrativo: Decreto 035 de 2021

Relacione el nombre, número y fecha de la última acta de reunión y sus compromisos: Para el proyecto Sueños de Prosperidad la mesa ya se cerró con ocasión al cumplimiento del periodo de seguimiento a la titularidad y ocupación de los inmuebles. Sin embargo, es necesario que cada trimestre se solicite un informe a los miembros permanentes e invitados de acuerdo a la competencia o a la oferta de servicios que estos brindan en cada periodo en el sector, esto es a las dependencias: Planeación, Administrativa, Educación, Salud, Policía Nacional, Imdes, Inspector de policía, DPS Regional, UARIV seccional Guaviare, ICBF Guaviare, SENA, Empoaguas, Ambientar, Energuaviare.

Es necesario una vez se entreguen los proyectos de vivienda en ejecución (Bosques de San Ignacio) se active la mesa y se de operatividad en el marco del decreto 035 de 2021.

- 2. Nombre: Comité técnico para la evaluación, reporte y seguimiento a obras civiles inconclusas del municipio de San José del Guaviare.**

Acto Administrativo: Resolución 824 de 2021

Relacione el nombre, número y fecha de la última acta de reunión y sus compromisos: Acta de comité de obras inconclusas –Resultados Consultoría 239-2022. 16 de agosto de 2022. Solicitar concepto a las aseguradoras para adquisición de garantías frente a futuras intervenciones en el proyecto apartamentos de Villa Andrea.

DELEGACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS

- 1. Nombre de la Junta: Ambientar S.A. E. S. P.**

Acto Administrativo de Delegación o Representación: Resolución 004 de 2020

Periodo de delegación o representación: 2020-2024

CAPITULO 8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- 1. Nombre: SINAS - Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico**

Descripción del S.I: El Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico tiene como objeto planear, definir, sistematizar, priorizar y monitorear los proyectos de inversión en infraestructura del sector. Asimismo, el sistema permite hacer consultas de indicadores



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

sectoriales, proyectos de inversión en infraestructura ejecutados y en proceso de ejecución, necesidades de inversión de los municipios y distritos del país y las condiciones de acceso a agua y saneamiento básico de su zona rural.

Fechas de Reporte: Se debe reportar de manera anual (antes de 30 de abril)

Sistema (Propio, Departamental, Regional o Nacional): Nacional (según Resolución 288 de 2020)

2. Nombre: Bases de Datos Proyectos de Vivienda (Vivienda nueva y mejoramiento de vivienda – urbano y rural)

Descripción del S.I: El Municipio cuenta con Bases de datos de los beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés social rural (vivienda nueva y mejoramiento de vivienda), vigencia 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021, así como las Bases de datos de los proyectos de vivienda de interés social prioritario urbana (Urb. Villa Andrea, Urb. Bosques de San Ignacio).

Fechas de Reporte: N/A – Solo para consulta

Sistema: Propio

3. Nombre: CONTROL EFECTIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ILEGALES EN LOS ARCOS DE DEFORESTACIÓN DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA

Descripción del S.I: la circular No. 4 DE: PROCURADOR DELEGADO CON FUNCIONES MIXTAS 3 PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS, indica en el numeral TERCERO: ORDENAR a las autoridades destinatarias de esta circular, reportar mensualmente a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarias los proyectos de infraestructura vial que se desarrollen y ejecuten o se prevean desarrollar y ejecutar en la región amazónica colombiana, sea que se trate de vías de orden primario, secundario o terciario, tanto en construcción, como en ampliación, mejoramiento y rehabilitación. El reporte debe incluir una descripción del proyecto, estado de ejecución, localización, información sobre los permisos ambientales que se requieren y su trámite, al igual que cronograma de actividades. La información se reporta en un formato preestablecido.

Fechas de Reporte: Trimestral

Sistema (Propio, Departamental, Regional o Nacional): Nacional – Procuraduría.

4. Nombre: DANE - diligenciamiento aplicativo Directorio Nacional de Infraestructura

Descripción del S.I: Reporte de información relacionada con los proyectos de infraestructura.

Fechas de Reporte: Semestral, la entidad lo solicita, envía usuario y contraseña.

Sistema (Propio, Departamental, Regional o Nacional): Nacional.

5. Nombre: Registro Nacional de Obras Inconclusas

Descripción del S.I: El Registro Nacional de Obras Inconclusas fue creado por medio de la ley 2020 de 2020 y tiene como fin registrar las obras civiles inconclusas en el territorio colombiano y ordenar que en él se incorpore la identificación de aquellas financiadas total o parcialmente con recursos públicos, y que requieren de un tratamiento de evaluación e inversión técnica, física o financiera, con el fin de definir su terminación. Se diligencia la certificación y de existir obras inconclusas se llena el formulario y se remite a la secretaria de hacienda.

Fechas de Reporte: Mensual (cinco días hábiles de cada mes)

Sistema (Propio, Departamental, Regional o Nacional): Nacional.

6. Nombre: FUT VICTIMAS



Descripción del S.I: Reporte de información de proyectos donde se atiende población víctima por parte de la secretaria de obras públicas. La información se completa en un formato remitido por la secretaria administrativa, y se regresa a esa misma dependencia.

Fechas de Reporte: Trimestral (cinco días hábiles de cada mes)

Sistema (Propio, Departamental, Regional o Nacional): Propio.

CAPITULO 9. TEMAS A PRIORIZAR AL INICIAR GOBIERNO

- Contar con personal idóneo y con experiencia en las áreas de acción de la dependencia, para el correcto desarrollo de las funciones misionales. Es importante contar con este apoyo de manera permanente para garantizar la consecución en las actividades de atención y orientación al usuario / beneficiario, así como en los procesos administrativos que incluye la coordinación y articulación con las entidades locales y nacionales.
- Realizar en coordinación con la secretaria de infraestructura del departamento el cronograma para la intervención de vías en el denominado plan verano a fin de priorizar los corredores más urgentes. Así mismo es necesario el cumplimiento de las obligaciones y/o trámites ante la corporación ambiental según las intervenciones a realizar.
- Acudir al concejo municipal a fin de solicitar las facultades necesarias para los procesos contractuales a los que haya lugar.
- Ejecutar las acciones necesarias relacionadas con el trámite de cuentas por pagar que lleguen al inicio de gobierno, en especial la de los deberes constitucionales en materia de subsidios.
- Coordinar con el Plan departamental de Aguas, las acciones o proyecciones a ejecutar en materia de saneamiento básico y agua potable, según la competencia.
- Garantizar el suministro de agua potable en coordinación con Empoaguas al asentamiento Nukak establecido en la vereda Agua Bonita, y a los demás resguardos de la periferia que lo requieran. Se cuenta con la dotación y transporte. Se requiere la gestión del agua con la empresa prestadora de servicio de acueducto.

CAPITULO 10. TEMAS ESTRATEGICOS EN TRÁMITE, EN GESTIÓN Y EJECUCIÓN

1. Culminar el proceso de asignación de beneficiarios a los apartamentos de la Urbanización Villa Andrea, el cual se debe realizar con el apoyo de la Secretaría Jurídica Municipal. En este mismo proyecto, gestionar los recursos para realizar las reparaciones a los apartamentos de la Urbanización Villa Andrea, los cuales fueron desalojados en el marco de la Querella Policiva adelantada por la Inspección de Policía por orden judicial.
2. A través del Convenio Interadministrativo de Cooperación N°076 de 2021 suscrito entre FONVIVIENDA, el Departamento del Guaviare y el Municipio de San José del Guaviare cuyo objeto se refiere a *“AUNAR ESFUERZOS PARA LA COFINANCIACIÓN DE CIEN (100) VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA DE INTERÉS RURALES BAJO LA MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA EN ESPECIE A LOS HOGARES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL DECRETO*



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

1077 DE 2015 O A LAS NORMAS QUE LO MODIFIQUE, SUSTITUYAN O ADICIONEN”, se encuentra en ejecución la materialización de las viviendas a cargo del CONSORCIO ONMI (según Contrato de Obra N°028F-2022). Dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas en dicho Convenio, el Municipio presenta de manera trimestral Ministerio de Vivienda, un Informe de avance (se dejará al día a 30 de diciembre de 2023).

3. El 29 de septiembre de 2023 se suscribió MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO entre el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA y el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE cuyo objeto se refiere a *“CREAR ESFUERZOS, VOLUNTADES Y ACCIONES, QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE*”, Programa denominado RENEVA MI CASA el cual cuenta con 100 cupos para nuestro Municipio y de acuerdo al comunicado recibido por parte de la Dra. CRISTINA JARAMILLO DIEZ, de la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico de MINVIVIENDA, queda pendiente una próxima reunión el fin de informar los siguientes pasos a seguir en la ejecución del programa.
4. Realizar la gestión ante el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, para el reinicio de los Proyectos de Vivienda de Interés Social Rural de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, los cuales a la fecha se encuentran suspendidos.
5. El municipio participa en calidad de cooperante en el CONVENIO N° 1205 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, de dicho proceso se derivó el contrato 596-2022 ejecutado por la gobernación y cuyo objeto comprende: *“CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”*. Este proyecto corresponde a las intervenciones en ejecución en el Parque de La Paz, se presenta informe mensual de acuerdo a los insumos presentados o compartidos por Contratista, Interventor y Supervisor (SIDG), se asiste a comités virtuales y presenciales convocados por la interventoría.
6. Convenio No FIP 518 de 2021 entre el *“DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE”*, cuyo objeto se refiere a *“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, y financieros, entre el Departamento administrativo para la prosperidad social-fondo de inversión para la paz-PROSPERIDAD SOCIAL -FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social productiva, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la integración, estabilización y reconciliación social de conformidad con la ficha de estructuración”* derivado del proceso anterior, se suscribe el contrato de obra No. 283 de 2022 cuyo objeto correspondió a: *“CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GUAVIARE- DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”* el cual como resultado de este proceso, se suscribió a los 18 días del mes de agosto del 2022 el contrato de obra 283-2022 con el CONSORCIO PLAZA SAN JOSÉ. Actualmente a obra presenta un 90% de avance, sin embargo, se encuentra suspendido por solicitud del DPS hasta el 31 de enero de 2024. Es importante Lograr la terminación y puesta en funcionamiento del proyecto denominado plaza del Barrio Porvenir, el proyecto entro a reformulación por solicitud del contratista e interventoría a fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuento a acabados especiales y RCI. El municipio proyecto los recursos del presupuesto de la



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME DE GESTIÓN 2020 - 2023

vigencia 2024 a fin de que se cuente con los recursos necesarios que den lugar a la financiación de las obras necesarias para la habilitación y funcionamiento del proyecto. El municipio ha solicitado el desembolso del 90% de los recursos al DPS, quedando pendiente el saldo a la terminación.

Durante la ejecución de la obra se presentaron retrasos, se inició en proceso por posible incumplimiento imputable al contratista, por parte de la supervisión se solicitó la aplicación de la multa, el contratista interpuso recurso y finalmente se procedió a ampliar el plazo a fin de lograr culminar el proyecto.

7. Los convenios interadministrativos para la transferencia de subsidios tanto de Empoaguas como de Ambientar quedan pendientes para liquidación, en atención a que estos se tramitan mes vencido, por tanto, los mismos se liquidan en el mes de enero de la siguiente vigencia o hasta cuando las empresas presenten la documentación.
8. Convenio interadministrativo No. 0086 de 2023, celebrado entre la financiera del desarrollo territorial S. A – FINDETER y el municipio de San José del Guaviare. El convenio busca la construcción de la 3 etapa del parque de la vida, el proyecto fue presentado a Mindeporte y actualmente se encuentra en etapa de maduración, se entregaron todas las subsanaciones y se está a la espera de comunicado por parte de esta entidad para la asignación de recursos.
9. Proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN PARA LA EROSIÓN Y MIGRACIÓN LATERAL DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GUAVIARE EN EL SECTOR DE INFLUENCIA DEL BFIM NO. 32 SEGUNDA FASE, EN LA VEREDA BARRACON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. Mediante comunicado SRR-RO-1036-2021 de fecha 29 de julio de 2021 se recibió el concepto de Viabilización del proyecto, a la fecha se han venido oficiando sobre la actualización del proyecto y asignación de recursos, sin obtener respuesta.
10. Proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIBERA DEL RIO GUAVIARE AGUAS ABAJO, DESDE LA ZONA CENTRO Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – FASE 2. Mediante comunicado SRR-RO-1421-2021 de fecha 12 de octubre de 2021 se recibió el concepto de Viabilización del proyecto, y mediante oficio SRR-RO-333-2023 de noviembre de 2023 ratificaron la aprobación, pero no la asignación de recursos.
11. El municipio presentó a Minvivienda en noviembre el proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE", actualmente se vienen desarrollando mesas de trabajo virtuales para la revisión de la documentación. La consultoría la entrego el PDA.
12. En el marco de la consultoría según Contrato 376-2021: Contratar una consultoría para realizar estudios y diseños de soluciones de agua potable y saneamiento básico para las veredas del Edén, Puerto Tolima, El Limón, Y Estudios Y Diseños De Soluciones De Agua Potable Para Las Veredas De Santa Lucia, Santa Rosa, Santa Rosa Baja Y Santa Rita Del municipio de san José del Guaviare, se presentó a ministerio de vivienda el proyecto, actualmente se vienen desarrollando mesas de trabajo virtuales para la revisión de la documentación.
13. En ejecución el proceso contractual que dio lugar a SELECCIONAR UN SOCIO INVERSIONISTA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA UNIÓN TEMPORAL PARA LA



FORMULACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.

CAPITULO 11. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL SIGUIENTE GOBIERNO

- Se recomienda realizar las gestiones pertinentes o en su efecto asignar los recursos necesarios para la actualización, modernización y depuración del parque automotor de la secretaría de obras públicas municipales a fin de sacar de circulación los vehículos y maquinas que cumplieron su ciclo de vida útil y generan constante inversión en reparaciones.
- Contar con un equipo interdisciplinar que garantice apoyo y asesoría en cada una de las áreas y sectores que maneja la dependencia, así mismo que brinde apoyo a la supervisión de las obras en ejecución y seguimiento a la calidad y estabilidad de las ya ejecutadas que se encuentren en las vigencias de los amparos, revisión y formulación de proyectos, asistencia técnica y todo lo relacionado para el funcionamiento de la dependencia
- En los proyectos de vivienda gestionados mediante convenios se recomienda que se asigne un rol más participativo a la entidad territorial, incluso solicitar ser la entidad ejecutora de los mismos teniendo en cuenta que por la naturaleza de estos se generan incumplimientos a los plazos y no se logran materializar, afectando a la comunidad de manera directa. En este sector también, se recomienda que, en los próximos Proyectos de Subsidios Familiares de Vivienda, no se realicen anticipos. Esto con el fin de garantizar la oportuna materialización y entrega de los subsidios.
- Realizar las gestiones pertinentes para culminar los proyectos de vivienda, en especial la urbanización Villa Andrea, toda vez que este proyecto se encuentra reportado como obra inconclusa.
- Apropiar los recursos necesarios o iniciar las gestiones ante las entidades financiadoras de proyectos, para la construcción de infraestructura que garantice la cobertura, ampliación, y acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado en el sector rural.
- Formular el plan de pavimentación de vías urbanas teniendo en cuenta factores como conectividad, manejo de aguas lluvias, corredores estratégicos, señalización y demás elementos que permitan garantizar condiciones de movilidad y seguridad para todos los actores viales. Es necesario Exigir al Departamento la concertación de los proyectos de infraestructura vial con la secretaría de planeación municipal y la secretaría de obras públicas municipales.
- Acudir a las entidades de control a fin de garantizar el seguimiento al cumplimiento de la materialización de los subsidios de vivienda rural otorgados durante las vigencias 2016-2019. Los subsidios fueron otorgados por el ministerio de Agricultura.
- Realizar y actualizar el inventario o catastro del sistema de alumbrado público del municipio, a fin de coordinar con la empresa prestadora del servicio de energía la revisión del contrato y cobro del servicio de energía para el sistema. De otro lado, en cuanto al alumbrado público se debe adquirir la dotación técnica e instrumental necesaria para el mantenimiento rutinario y preventivo al sistema modernizado (led) en el cual la altura de la posteria es superior a 8 metros.
